



وزارت نیرو

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

گزارش عملکرد طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای

به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل اول

طرحها و پروژه های تملک دارائیهای
سرمایه ای ، اعتبارات مصوب ، عملکرد
منابع تامین اعتبار

۱-۱- طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش :


مبالغ به میلیون ریال

نام منبع	طرحهای انتفاعی	طرحهای غیر انتفاعی	جمع کل
تعداد طرح	۸	۱۲	۲۰
تعداد پروژه	۹	۴۰	۴۹
اعتبار مصوب	۱۹۰۶۷۴۷۱	۲۸۳۶۶۶۱	۲۱۹۰۴۱۳۲
تخصیص اعتبار	۱۲۹۷۴۴۸۶	۳۹۲۵۰۸۶	۱۶۸۹۹۵۷۲
عنوان پیمانهای اجرائی	تعداد	مبلغ قراردادها (مبالغ به میلیون ریال)	
(۱) سد	۳	۳,۶۱۶,۵۷۷,۷۶۸,۷۱۷	
(۲) خط انتقال	۸	۱,۹۵۵,۹۸۴,۴۶۹,۰۴۸	
(۳) لایروبی و سایر	۸	۸۹۸,۳۱۴,۳۴۱,۲۲۲	

اطلاعات مذکور می بایست بر اساس صورت وضعیت مالی حسابرسی شده باشد

طبق صورت های مالی طرح ۱۳۰۷۰۰۲۳۲۱ تامین، انتقال آب و ایجاد تاسیسات فاضلاب کشور کمکی طرح شماره ۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴ با نام تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد می باشد که از وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. در امار تعداد طرح ها نیست.

۱-۲- مشخصات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای :



۱-۲-۱- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تعداد طرح	تعداد پروژه	درآمد عمومی	صندوق توسعه ملی	اوراق مشارکت تضمین شرکت	اوراق مشارکت تضمین دولت	اسناد خزانه اسلامی	سایر (منابع داخلی، فاینانس داخلی و خارجی ...)	جمع کل
انتفاعی	ملی	۴	۴	۳۵۵۳۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۵۳۲۹۷
	ملی استانی	۴	۵	۵۳۴۵۱۷۴	۷۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰۴۵۱۷۴
	استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۸	۹	۸۸۹۸۴۷۱	۷۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵۹۸۴۷۱
غیر انتفاعی	ملی	۹	۹	۳۶۷۶۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۷۶۷۸۱
	ملی استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	استانی	۳	۳۱	۱۶۲۸۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲۸۸۸۰
	جمع	۱۲	۴۰	۵۳۰۵۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۳۰۵۶۶۱
جمع کل	ملی	۱۳	۱۳	۷۲۳۰۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۲۳۰۰۷۸
	ملی استانی	۴	۵	۵۳۴۵۱۷۴	۷۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰۴۵۱۷۴
	استانی	۳	۳۱	۱۶۲۸۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲۸۸۸۰
	جمع	۲۰	۴۹	۱۴۲۰۴۱۳۲	۷۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹۰۴۱۳۲

منابع تامین اعتبار (ملی استانی)

منابع تامین اعتبار (استانی)

منابع تامین اعتبار (ملی)

۱-۲-۲- فصول سرمایه گذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

فصول سرمایه گذاری					تعداد پروژه	تعداد طرح	شرح	
جمع فصول	فصل هفتم	فصل ششم	فصل دوم	فصل اول				
۳۵۵۳۲۹۷	۰	۱۸.۳۴۴	۰	۳۵۳۴۹۵۳	۴	۴	ملی	انتفاعی
۱۳۰۴۵۱۷۴	۵۳.۸۸۵	۱۵۲.۸۱۶	۰	۱۲۸۳۸۴۷۳	۵	۴	ملی استانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استانی	
۱۶۵۹۸۴۷۱	۵۳.۸۸۵	۱۷۱.۱۶۰	۰	۱۶۳۷۳۴۲۶	۹	۸	جمع	
۳۶۷۶۷۸۱	۲۴.۱۸۵	۰	۰	۳۶۵۲۵۹۶	۹	۹	ملی	غیر انتفاعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی استانی	
۱.۶۲۸.۸۸۰	۱۷.۴۵۰	۰	۰	۱۶۱۱۴۳۰	۳۱	۳	استانی	
۵۳۰.۵۶۶۱	۴۱.۶۳۵	۰	۰	۵۲۶۴۰.۲۶	۴۰	۱۲	جمع	
۷۲۳۰.۱۷۸	۲۴.۱۸۵	۱۸.۳۴۴	۰	۷۱۸۷۵۴۹	۱۳	۱۳	ملی	جمع کل
۱۳۰۴۵۱۷۴	۵۳.۸۸۵	۱۵۲.۸۱۶	۰	۱۲۸۳۸۴۷۳	۵	۴	ملی استانی	
۱.۶۲۸.۸۸۰	۱۷.۴۵۰	۰	۰	۱.۶۱۱.۴۳۰	۳۱	۳	استانی	
۲۱۹۰.۴۱۳۲	۹۵.۵۲۰	۱۷۱.۱۶۰	۰	۲۱۶۳۷۴۵۲	۴۹	۲۰	جمع	

فصول سرمایه گذاری (ملی استانی)

فصول سرمایه گذاری (استانی)

فصول سرمایه گذاری (ملی)

۱-۲-۳- عملکرد منابع تامین اعتبار :

مبالغ به میلیون ریال

سال مورد گزارش					شرح
اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافتی	عملکرد	مصرف نشده	
۱۴۲۰۴۱۳۲	۹۹۹۵۷۲	۹۹۹۵۷۲	۹۹۹۵۷۲	.	منابع عمومی دولت
۷۷۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰	.	صندوق توسعه ملی
---	---	---	---	---	اوراق مشارکت با تضمین شرکت
---	---	---	---	---	اوراق مشارکت با تضمین دولت
---	---	---	---	---	اسناد خزانه اسلامی
---	---	---	---	---	سایر (منابع داخلی ، فاینانس داخلی ، فاینانس خارجی و ...)
۲۱۹۰۴۱۳۲	۱۶۸۹۹.۵۷۲	۱۶۸۹۹.۵۷۲	۱۶۸۹۹.۵۷۲		جمع



۱-۲-۴- وضعیت اعتبارات دریافتی از محل منابع عمومی در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تعداد طرح	تعداد پروژه	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافتی از خزانه	عملکرد		برگشت به خزانه
						قطعی	غیر قطعی	
انتفاعی	ملی	۴	۴	۳۵۵۳۲۹۷	۲.۹۲۹.۰۰۰	۲.۹۲۹.۰۰۰	۲.۴۹۶.۴۹۳	۴۳۲.۵۰۷
	ملی استانی	۴	۵	۱۳۰۴۵۱۷۴	۱۲.۴۲۴.۴۸۶	۱۲.۴۲۴.۴۸۶	۱۰.۶۲۵.۵۶۶	۱.۷۹۸.۹۲۰
	استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۸	۹	۱۶۵۹۸۴۷۱	۱۵.۳۵۳.۴۸۶	۱۵.۳۵۳.۴۸۶	۱۳.۱۲۲.۰۵۹	۲.۲۳۱.۴۲۷
غیر انتفاعی	ملی	۹	۹	۳۶۷۶۷۸۱	۶۴۷.۵۲۶	۶۴۷.۵۲۶	۶۳۹.۸۵۷	۷.۶۶۹
	ملی استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	استانی	۳	۳۱	۱.۶۲۸.۸۸۰	۸۹۸.۵۶۰	۸۹۸.۵۶۰	۸۶۶.۳۶۳	۳۲.۱۹۷
	جمع	۱۲	۴۰	۵۳۰۵۶۶۱	۱.۵۴۶.۰۸۶	۱.۵۴۶.۰۸۶	۱.۵۰۶.۲۲۰	۳۹.۸۶۶
جمع کل	ملی	۱۳	۱۳	۷۲۳۰۰۷۸	۳.۵۷۶.۵۲۶	۳.۵۷۶.۵۲۶	۳.۱۳۶.۳۵۰	۴۴۰.۱۷۶
	ملی استانی	۴	۵	۱۳۰۴۵۱۷۴	۱۲.۴۲۴.۴۸۶	۱۲.۴۲۴.۴۸۶	۱۰.۶۲۵.۵۶۶	۱.۷۹۸.۹۲۰
	استانی	۳	۳۱	۱.۶۲۸.۸۸۰	۸۹۸.۵۶۰	۸۹۸.۵۶۰	۸۶۶.۳۶۳	۳۲.۱۹۷
	جمع	۲۰	۴۹	۲۱۹۰۴۱۳۲	۱۶.۸۹۹.۵۷۲	۱۶.۸۹۹.۵۷۲	۱۴.۶۲۸.۲۷۹	۲.۲۷۱.۲۹۳

اعتبارات دریافتی (ملی استانی)

اعتبارات دریافتی (استانی)

اعتبارات دریافتی (ملی)

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	انتفاعي يا غ انتفاعي	نام طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش				جمع دریافتي از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی			
						اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد					
									قطعی		غیر قطعی			
۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	انتفاعی	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شورجه	۱۳۸۸	۱۴۰۵	۱۱۲۴۹۸۸۴	۹۱۳۱۳۶۱۳	۹۱۳۱۳۶۱۳	۹۱۳۱۳۶۱۳	۰	۰	۱۶۷۷۸۴۱۲	۶۵.۹۹	۸۲.۷۴
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	انتفاعی	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۸۹	۱۴۰۷	۱۱۶۶۹۱۳	۶۶۶۱۳۹	۶۶۶۱۳۹	۶۶۶۱۳۹	۰	۰	۱۸۸۶۱۵۰	۴۱.۸۶	۴۳.۴
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	انتفاعی	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۸۳	۱۴۰۷	۴۴۶۲۸۲	۲۰۹۳۷۱	۲۰۹۳۷۱	۲۰۹۳۷۱	۰	۰	۱۰۳۶۰۸۰	۴۶.۸۶	۴۸.۱۵
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	انتفاعی	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۷۶	۱۴۰۷	۱۸۲۰۹۵	۱۴۰۶۴	۱۴۰۶۴	۱۴۰۶۴	۰	۰	۱۲۲۶۲۰۴	۶۵.۸۹	۶۶.۳۱

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	انتفاعی یا غ انتفاعی	نام طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		برگشتی به خزانه	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی	
									قطعی	غیر قطعی			درصد تجمعی	سال مورد گزارش
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	انتفاعی	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دوستی	۱۳۷۵	۱۴۰۱	۱۹۶۰۰۵	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰	۰	۱۷۸۳۷۶۹	۴	۱۰۰
۶	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	غیرانتفاعی	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه های مرزی خراسان رضوی	۱۳۷۳	متمركز	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۰	۰	مستمر	مستمر	۴۰
۷	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	غیرانتفاعی	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۳۴۱	متمركز	۳۵۷۸۱۰	۱۵۲۶۳	۱۵۲۶۳	۱۵۲۶۳	۰	۰	مستمر	مستمر	۳۳
۸	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	غیرانتفاعی	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۳۸۸	متمركز	۴۴۰۴۰	۲۰۴۰	۲۰۴۰	۲۰۴۰	۰	۰	مستمر	مستمر	۷۵

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	انتفاعی یا غ انتفاعی	نام طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش				پیشرفت فیزیکی	
						اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون
									قطعی	غیر قطعی	
۹	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	غیرانتفاعی	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۷۴	متمرکز	۳۲۵۸۳۲	۱۷۴۰۳۲	۱۷۴۰۳۲	۱۷۴۰۳۲	۰	مستمر
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	انتفاعی	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	متمرکز	متمرکز	۲۴۶۹۰۰۰	۲۳۷۹۰۰۰	۲۳۷۹۰۰۰	۲۳۷۹۰۰۰	۰	مستمر
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	غیرانتفاعی	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	متمرکز	متمرکز	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۰	مستمر
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۷	انتفاعی	ساختمان سد چهجه و شبکه آبیاری و زهکشی	۱۳۸۳	۱۴۰۱	۳۱۶۵۶	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۰	مستمر
۷۳	۶۴	درصد تجمعی	سال مورد گزارش	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	برگشتی به خزانه	قطعی	غیر قطعی	۰	۰	۰	۷۳
۹۹	۱	درصد تجمعی	سال مورد گزارش	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	برگشتی به خزانه	قطعی	غیر قطعی	۰	۰	۰	۹۹

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	انواع ی یا غ انتفاع ی	نام طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		برگشتی به خزانه	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی	
									قطعی	غیر قطعی			سال مورد گزارش	درصد تجمعی
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۲	انتفاعی	ساختمان سد قره تیکان و شبکه آبیاری و زهکشی	۱۳۸۳	۱۴۰۱	۲۱۸۶۳۶	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۰	مستمر	۰	۹۹	
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	غ انتفاعی	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۳۸۴	۱۴۰۱	۲۲۸۰۸	۱۱۸۰۰	۱۱۸۰۰	۱۱۸۰۰	۰	مستمر	۵۰	مستمر	
۱۵	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	انتفاعی	تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۲۶۱۷۰۰۰	۲۲۲۱۲۹۹	۲۲۲۱۲۹۹	۲۲۲۱۲۹۹	۰	۲۶۱۷۰۰۰	۳۰۲	۵۰۱۸	
۱۶	۱۳۰۷۰۰۲۳۲۱	انتفاعی	کمک به تامین و انتقال آب و ایجاد تاسیسات فاضلاب در سطح کشور	۱۳۸۳	۱۴۰۱	۴۹۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰	۰	۴۹۰۰۰۰		۳۰۳۹	
۱۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	غ انتفاعی	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۳۸۳	مستمر	۴۳۵۰۰۰	۴۲۳۱۰۰	۴۲۳۱۰۰	۴۲۳۱۰۰	۰	۴۲۳۱۰۰	مستمر	مستمر	
۱۸	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	غ انتفاعی	تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۱۳۸۳	مستمر	۱۳۲۹۱	۱۳۲۹۱	۱۳۲۹۱	۱۳۲۹۱	۰	۱۳۲۹۱	مستمر	مستمر	
			جمع			۲۰۲۷۵۲۵۲	۱۶۰۰۱۰۱۲	۱۶۰۰۱۰۱۲	۱۶۰۰۱۰۱۲	۰	۱۶۰۰۱۰۱۲	-	-	

۱-۲-۷- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (استانی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	انتفاعی یا غ انتفاعی	نام طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش					جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی		
						اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد			برگشتی به خزانه	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
									قطعی	غیر قطعی				
۱	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	غیر انتفاعی	اجرای حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی	۱۴۰۰	۱۴۰۷	۲۲۶۰۰۰	۵۲۰۵۰	۵۲۰۵۰	۵۲۰۵۰	۰	۰	۴۷۰۳۶۶	۳	۲۳.۲۶
۲	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	غیر انتفاعی	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۸۰	۱۴۰۵	۲۶۲۰۰۰	۱۷۷۸۰۰	۱۷۷۸۰۰	۱۷۷۸۰۰	۰	۰	۸۶۶۷۰۹	۵	۲۰.۰۴
۳	۱۳۰۷۰۰۳۲۵۵	غیر انتفاعی	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۷۹	۱۴۰۵	۱.۱۴۰.۸۸۰	۶۶۸.۷۱۰	۶۶۸.۷۱۰	۶۶۸.۷۱۰	۰	۰	۲۳۶۵۵۸۹	۷	۳۷
		جمع کل				۱۶۲۸۸۸۰	۸۹۸۵۶۰	۸۹۸۵۶۰	۸۹۸۵۶۰	۰	۰	۳۷۰۲۶۶۴	-	-

۱-۳- وضعیت اعتبارات پژوهشی تفویض اختیار شده از محل طرح تحقیقات کاربردی از طرف مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران : فاقد عملکرد

(پیرو ابلاغیه نظام نامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه ای برای سال مالی ۱۳۹۴)

شرح	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
اعتبار تخصیصی در سال مورد گزارش		
تعداد پروژه های پژوهشی عقد قرارداد شده		
جمع مبالغ پروژه های عقد قرارداد شده		
تعداد پروژه های پژوهشی تحت نظارت		
جمع مبالغ پروژه های پژوهشی تحت نظارت		
هزینه کرد اعتبارات تخصیصی		
نسبت اعتبارات هزینه شده به تخصیص داده شده :		
مشکلات و موانع موجود :		
پیشنهادهای :		

۱-۴- وضعیت نقل و انتقال طرحها و پروژه هایی که در سال مالی ۱۴۰۳ خاتمه یافته و به عملیات جاری منتقل گردیده است :

شماره طرح	نام طرح	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ خاتمه
۱۳۰۷۰۰۳۲۳۲	ساختمان سد قره تیکان و شبکه آبیاری و زهکشی	ساختمان سد قره تیکان * سر رود	۱۱۵,۰۶۷	۱۴۰۱
۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی	شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی	۲,۲۸۹	۱۴۰۲
۱۳۰۷۰۰۳۲۳۰	ساختمان سد زنگلانو و شبکه آبیاری و زهکشی	ساختمان سد اییورد * زنگلانو	۱۹۳	۱۴۰۱

۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است :

ردیف	شماره طرح	نام طرح / پروژه	حوزه آبریز	اهداف طرح
۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	اجرای حفاظت و احیای ابهای زیرزمینی	بهسازی، ترمیم و افزایش کارایی (راندمان) تغذیه مصنوعی شاندیز- شهرستان بینالود	ارتفاعات بینالود	

۱-۶- طرح‌هایی که نسبت به برنامه زمانبندی با تاخیر مواجه می‌باشد :

ردیف	نام طرح / پروژه	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه اسفند ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی واقعی اسفند ۱۴۰۲	میزان عقب بودن از برنامه	علت تأخیرات
1	تأمین آب مشهد از طریق جابجایی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	مشهد	۱۰/۷۷	۸۹/۶۵	۲۱/۱۱	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
2	سد مخزنی شوربجه و تأسیسات وابسته	سرخس	۱۶/۷۳	۹۹/۶۵	۱۷/۷	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
3	آبرسانی به شهر سرخس	سرخس	۳/۵۱	۶۰/۴۸	۷/۲	(بعلت عدم تخصیص مناسب و مشکلات اجتماعی و معارضین)
4	تأمین آب مشهد از سدکارده (پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی)	مشهد	۹۵/۹۶	۵/۸۵	۴۵/۱۱	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
5	آبرسانی به شهر نیشابور و فیروزه از سد بار	نیشابور	۵/۶۱	۷۸/۴۱	۷۲/۱۹	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
6	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی ایبورد	درگز	۱۰۰	۲۶/۹۹	۷۴/۰	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
7	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیامک	مشهد	۵/۹۹	۶/۷۵	۹/۲۳	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
8	سامانه آبگیر شناور سد مخزنی دوستی شهرستان سرخس	سرخس	۹۷	۹۳/۸۰	۰۷/۱۶	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
9	آبرسانی از سد مخزنی تبارک به شهر قوچان	قوچان	۱۰۰	۹۷	۳	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
10	عملیات ساماندهی رودخانه کلات (مرحله ۲)	کلات	۱۰۰	۷/۸۷	۳/۱۲	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
11	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان غرب - حفره تجهیز و اجرای شبکه جمع آوری 25 حلقه چاه	مشهد	۵/۹۷	۲/۷۶	۳/۲۱	عدم تخصیص اعتبارات مصوب جهت پرداخت مطالبات قطعی ارکان طرح و مشکلات اجتماعی
12	طرح اضطراری تأمین آب (شرب و بهداشت) از چاههای مجتمع عباس آباد و تنگل شور واقع در شرق مشهد	مشهد	۵۵/۹۰	۶۲/۸۳	۹۳/۶	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح و مشکلات اجتماعی
13	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال 50 حلقه چاه	مشهد	۵۴	۲۶/۱۸	۷۴/۳۵	مشکلات اجتماعی و عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
14	ایجاد طرح‌های کوچک تأمین و انتقال آب-احداث و اصلاح کانال انتقال آب-ارضی پایاب سدهای چپبیه و قره تپکان	کلات	۱۰۰	۶۱/۹۹	۳۹/۰	لزوم تخصیص کامل اعتبارات مصوب جهت پرداخت مطالبات قطعی ارکان طرح
15	احداث سازه آبگیر و اجرای خط انتقال رواناب رودخانه شوررود شهرستان میان جلگه	میان جلگه	۹۵/۵۹	۰۴/۴۷	۹۱/۱۲	مشکلات اجتماعی
16	ساماندهی سازه های تغذیه مصنوعی فاروب رومان شهرستان نیشابور	نیشابور	۱۰۰	۹۰	۱۰	تحويل موقت
17	عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو نیشابور (بوژمهران، اردوغش و محسن آباد)	نیشابور	۷۰/۱۰	۵/۶	۲/۴	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
18	احداث دهانه های آبگیر رودخانه کپکان -گرنی شهرستان درگز	درگز	۲۰/۳۰	۲	۲/۲۸	مشکلات اجتماعی و عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
19	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبگیر کشاورزی شهرستان سرخس	سرخس	۲۲/۳۳	۶۸/۲۲	۵۴/۱۰	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
20	کانال انتقال آب جمعبان شهرستان چناران	چناران	۳۸	۱۵/۱۲	۸۵/۲۵	مشکلات اجتماعی و عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
21	احداث قسم و کانال انتقال آب اسبیل -حوت آباد شهرستان گلپهار	گلپهار	۴۸/۹۸	۷۹/۴۴	۶۹/۵۳	مشکلات اجتماعی و عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح

۱-۷- طرحها و پروژه هایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی ۱۴۰۳ مورد اجراء قرار گرفته اند :

ردی ف	نام طرح	شماره طرح	نام طرح	حوضه آبریز	اهداف طرح	مطالعات طرح انجام یافته و دارای مصوبه است	طرح دارای مجوز ماده ۲۳ است	طرح اجرایی است
۱	ایجاد طرحهای کوچک تامین و انتقال آب	خ-۲۵۵ ۱۳۰۷۰۰۳	احداث دهانه های آبرگیر رودخانه کپکان - گرنی شهرستان درگز	کلات	بهره برداری بهینه و عادلانه و تامین آبی تمامی بهره برداران	*	*	*
۲			عملیات اجرایی احداث بند انحرافی خرو نیشابور (بوژمهران، اردوغش و محسن آباد)"	نیشابور	بررسی وضعیت موجود سیستم های انحراف، آبرگیری، انتقال و نحوه تقسیم آب با توجه به حقایق ها- بررسی وضعیت موجود آبیاری و کشاورزی منطقه مطالعاتی- تهیه طرح ساماندهی سیستم های انحراف، آبرگیری و انتقال تا محدوده اراضی پایاب نهرهای آبیاری	*	*	*
۳			کانال انتقال آب جمعاب شهرستان چناران	چناران	پوشش کانال های سنتی جهت افزایش و بهبود وضعیت آبیاری حدود ۴۵۰ هکتار از اراضی زراعی در محدوده ی روستاهای مذکور	*	*	*
۴			احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبرگیر کشاورزی شهرستان سرخس	سرخس	بمنظور امکان انحراف و آبرگیری سیلابهای فصلی حوضه آبریز رودخانه تجن (هریرود و کشف رود) از طریق بهسازی ۳ سردهانه آبرگیر سنتی نورزآباد، مظفری و انقلاب و انتقال دبی سیلاب به کانالهای سنتی	*	*	*
۵			احداث سازه آبرگیر و اجرای خط انتقال رواناب رودخانه شوررود شهرستان میان جلگه	میان جلگه	پیشگیری از اختلاط آب شیرین حوضه آبریز با آب غیر کیفی (شور) آبراهه های واقع در مسیر طولی رودخانه شوررود جهت انتقال حداکثر دبی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه به اراضی تحت کشت روستای شوررود	*	*	*

۱-۸- طرحها و پروژه هایی که اجرای آنها متوقف شده یا ردیف اجرایی آن حذف شده است :

شماره طرح	نام طرح	نام پروژه	تاریخ توقف / حذف	علل توقف / حذف
۱۰۲ خ ۱۳۰۴۰۱۲	تامین زیر ساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (آب)	شهرک صنعتی ناحیه ۵ مشهد		حذف ردیف اعتباری توسط سازمان برنامه بودجه کشور

۱-۹- عملکرد پروژه‌های مرتبط با طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان‌ها

۱-۹-۱- جدول عملکرد برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و مدیریت توأمان آب و برق

پروژه	خلاصه اقدامات انجام شده	ملاحظات			سال گزارش	
		واحد			عملکرد	پیشرفت
برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی	اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی	کل چاه‌های مشمول تعدیل			۱۶۶۶	۱۰۰
	نصب کنتور و ابزار سنجش میزان برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی	دستگاه / چاه			۳۴۵	۳۵۷
	پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حلقه			۹۰۲	۲۰۷۱
	حجم صرف‌جویی شده ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز	میلیون مترمکعب بدون لحاظ شدن حجم اصلاح و تعدیل			۱۱۵.۹۶	۲۰۰.۵
مدیریت توأمان آب و برق	پیاده‌سازی فرایند مدیریت توأمان آب و برق برای مدیریت چاه‌های کشاورزی	هزار حلقه چاه کشاورزی			۴۰۸۹	۳۹۳۹
۹۶						

۱-۹-۲- جدول عملکرد پروژه کنتورهای هوشمند حجمی در سال مورد گزارش :

تعداد چاه‌های کشاورزی (حلقه)	تعداد قراردادهای منعقد شده فروش کنتور (عدد)	تعداد کنتور منصوبه (دستگاه)	تعداد کنتورهای نصب نشده به دلیل		تعداد کنتور سالم قرائت شده بعد از نصب	اقدامات نگهداری و پشتیبانی از کل کنتورهای منصوبه
برقی	دیزلی		عدم همکاری بهره‌بردار	عدم ارائه کنتور توسط کنتورساز		
۸۸۹۵	۹۸۲	۰	۱۵	۶	۳۵۱	بروزرسانی و تعمیرات- اخذ گواهی صحت سنجی

خرید کنتور هوشمند توسط مالکین چاه ها انجام می شود

۱-۹-۳- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش :

ردیف	نام مشاور	تعداد گروه	تجهیزات بر اساس شرح خدمات		شروع قرارداد	خاتمه قرارداد	حوزه عمل		مبلغ قرارداد (میلیون ریال)
			کامل	نقص			آب زیرزمینی	آب سطحی	
۱	مهاب ثامن	۵۸	*		۰۱/۰۱/۱۴۰۴	۲۹/۱۲/۱۴۰۴	*		۶۰۰۰۰
۲	آبنمود توس	۱۲	*		۰۱/۰۱/۱۴۰۴	۲۹/۱۲/۱۴۰۴		*	۱۵۰۰۰

تعداد کل گروه ها	تعداد کارشناس صحرایی (بازدید کننده)	کل بازدیدهای ثبت شده در سامگشت	تعداد چاه مجاز بازدید شده	تعداد چاه غیرمجاز شناسایی شده	تعداد سایر منابع (قنات، آبهای سطحی و...) بازدید شده	سهم چاه های بازدید شده از برنامه اقدام استان
۷۰	۷۰	۱۹۷۵۶	۱۸۱۲۷	۱۲۴۸	—	٪۱۰۰

۱-۱۰- جدول عملکرد شکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش

ایجاد شکل	در دست مطالعه							تعداد منبع آبی						نام دشت	نام و کد محدوده مطالعاتی	ردیف	
	نام شکل				وسعت دشت	پیشرفت ریالی	پیشرفت فیزیکی	نام مشاور	کانال	سد	رودخانه	قنات	چشمه				چاه
	تعاونی تولیدی	شرکتهای سهامی زراعی	تعاونی آب بران	صنفی													
	انجمن صنفی کارفرمایای مالکین چاه های مجاز دشت رخ													۲۶۴	رخ	دشت رخ	۱
	شرکت تعاونی کشاورزان تایباد													۶۲	باخرز	شهرستان باخرز	۲
	اتاق اصناف شهرستان تربت جام													۵۷	صالح آباد	شهرستان صالح آباد	۳

۱-۱۱- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب (داناب) : از محل اعتبارات جاری

قرارداد	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	هزینه کرد (میلیون ریال)	تعداد دانش آموز مورد هدف	پیشرفت فیزیکی	مدت قرارداد
تفاهم نامه طرح داناب شماره ۳/۱۱/۲۳۵۷۷/۱۴۰۳	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴ میلیارد ریال	از محل بودجه جاری صورت وضعیت شماره یک به ارزش ۲ میلیارد ریال هم اکنون در حال رسیدگی برای پرداخت است.	تعداد دانش آموزان ۳۲۰ هزار نفر	۷۵ درصد در حال حاضر(تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۴) تایید شده است.	۱۲ ماه

۱۲-۱- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء در کشور

(هدف: ۱۱۵/۹۶ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت)

۱-۱۲-۱- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک استان در سال مورد گزارش :

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی	۲۲.۵	۹۳.۴۶	-	۱۱۵.۹۶
احیاء و تعادل بخشی	۴۰.۹	۱۵۹.۶	۲۴۵	۴۴۵.۵
اقدامات	۲۰۷۱	۱۲۸۳	۱۶۶۶	۵۰۲۰
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۱۰۰	-	۱۰۰
	احیاء و تعادل بخشی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز در سال مورد

گزارش: حوضه آبریز کویر مرکزی

(هدف: ۶۷/۱ میلیارد متر مکعب **کاهش برداشت**)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی	۳.۴	۶۳.۷	-	۶۷.۱
احیاء و تعادل بخشی	۸.۱	۸۳.۶	۱۵۵.۷	۲۴۷.۴
اقدامات	۷۸۰	۷۴۱	۱۱۳۳	۲۶۵۴
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۱۰۰	-	۱۰۰
	احیاء و تعادل بخشی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰



۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز در سال مورد

گزارش: حوضه آبریز کویر اترک

(هدف: ۱/۸۵ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی	۱.۶	۰.۲۵	-	۱.۸۵
احیاء و تعادل بخشی	۰.۸	۰.۸	۳.۹	۵.۵
اقدامات	۸۷	۱۹	۲۵	۱۳۱
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۱۰۰	-	۱۰۰
	احیاء و تعادل بخشی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰



۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز در سال مورد

گزارش: حوضه آبریز قره قوم

(هدف: ۳۹/۱۲ میلیارد متر مکعب **کاهش برداشت**)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی	۱۷.۳	۲۱.۸۲	-	۳۹.۱۲
احیاء و تعادل بخشی	۳۱.۸	۶۳.۷	۷۴.۳	۱۶۹.۸
اقدامات	۱۱۸۱	۴۴۰	۴۳۳	۲۰۵۴
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۱۰۰	-	۱۰۰
	احیاء و تعادل بخشی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز در سال مورد

گزارش: حوضه آبریز نمکزار خواف

(هدف: ۸/۵۲ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی	۰.۲	۸.۳۲	-	۸.۵۲
احیاء و تعادل بخشی	۰.۰۶	۱۱.۴	۱۱.۴	۲۲.۸۶
اقدامات	۲۳	۸۳	۷۵	۱۸۱
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۱۰۰	-	۱۰۰
	احیاء و تعادل بخشی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۱۳- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب :



۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	تعداد	تغذیه مصنوعی
۲.۵	۴۲.۳۳	۱۱	۴۲.۳۳	۱۳	۴۲.۳۳	۲۰.۲	۴۲.۳۳	ظرفیت (میلیون متر مکعب)	
۵۰۲۰	۹۰۲	۴۴۶۹	۱۳۶۰	۳۸۳۵	۱۰۰۰	۳۸۶۶	۱۰۰۶	تعداد	تعادل بخشی
۴۴۵.۵	۲۰۰	۳۵۵.۵	۱۰۰	۳۱۸	۴۰	۳۱۱.۴	۵۰	ظرفیت (میلیون متر مکعب)	
۵	۳	۱۰	۷	۱۵	۷	۱۲	۱۲	تعداد سطحی	ایستگاه های سنجش از محل اعتبارات طرح شماره ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵
۴	۲	۱۲	۷	۲۱	۷	۱۲	۱۲	تعداد زیرزمینی	
--	--	--	--	--	--	--	--	کیلومتر	مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب ها و دریاچه
۶۸۴ سراسری ۹۸۶ موردی	۱۷۸۷ سراسری ۱۲۰۰ موردی	۷۲۵ سراسری ۱۸۸۶ موردی	۸۳۱ سراسری ۱۳۳۵ موردی	۲۴۸۱	۵۰۰	۳۳۰	۶۵۱	کیلومتر	مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها
۲۴۸.۲	۱۱۷	۱۸۶.۵	۱۰۰.۴	۱۸۶	۱۵۰	۱۳	۴.۳۶	کیلومتر	عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ها
								کیلومتر	عملیات اجرایی لایروبی رودخانه ها
								توسعه	کمکهای فنی و اعتباری
								بهبود (هکتار)	

ادامه ۱-۱۳- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب :

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۸	۸	۲	۲	۰	۰	۱۳	۱۳	تعداد/ نقطه محل	مطالعه/ نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری
۲	۲	۲	۲	۰	۰	۱۳	۱۳	تعداد/ نقطه محل	پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری
۰	۰	۲	۲	۱	۱	۲	۲	پروژه	طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)
۰	۰	۵	۵	۳	۳	۶	۶	پروژه	طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)

متأسفانه در سال ۱۴۰۳ هیچ گونه تخصیصی از اعتبارات عمومی برای طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در نظر گرفته نشد. مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات ماده ۶۳ (حق اشتراک) مصوب شده بود که تا کنون هیچ وجهی ابلاغ نشده است.

۱۴-۱- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل :

عنوان برنامه		هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و سواحل (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	۴ ساماندهی ۱۰ لایروبی	۲ ساماندهی ۱۰ لایروبی	۴۰۰۰۰	۱۶۸/۸ ساماندهی ۲۲۳/۴۲ لایروبی
	ملی (مرزی)	-	-	-	-
	استانی (غیر مرزی)	۲ ساماندهی ۱۰۱ لایروبی	۸ ساماندهی ۲۳۸ لایروبی	۱۶۰۰۰	-
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم رودخانه ها	ملی	۱۷۲۸	۱۶۷۰	-	۹۶/۶۴
	استانی	۵۹	۰	-	-
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه ها	ملی	۸۳	۱۷	۵۲۷۷۹	۲۰/۴۸
	استانی	۱۵	۱۵	۲۵۰۰	۱۰۰
اجرای حد بستر و حریم رودخانه ها (نشانه گذاری)	ملی	۲۲۰	۳۵	۱۲۵۰۰	۱۵/۹
	استانی	۱۰	۰	-	-
مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریاچه و تالاب ها	ملی	-	-	عدم مصداق	-
	استانی	-	-	-	-
اجرای حد بستر و حریم دریاچه و تالاب ها (نشانه گذاری)	ملی	-	-	عدم مصداق	-
	استانی	-	-	-	-

اعتبار مطالعات مرحله دوم ساماندهی در سال ۱۴۰۳، به این شرکت ابلاغ شده است.
 *اعتبار ۱۶۰۰۰ میلیون ریال از منابع داخل (جاری) به طرح تملک دارایی استانی پرداخت شده است

ادامه ۱-۱۴- عملکرد برنامه طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و طرح مرمت و بازسازی
تاسیسات آبی در دست بهره برداری :

عنوان برنامه	هدف (پروژه/نقطه محل)	عملکرد (پروژه/نقطه محل)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
مطالعه/نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۸	۸	۱۸۰۰	۱۰۰
پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۳	۳	۱۰۰۰۰	۱۰۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)	۰	۰	۰	۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)	۰	۰	۰	۰

۱-۱۵- وضعیت نیروگاه برقابی : نداریم

وضعیت مطالعه نیروگاه های برق آبی استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	فاز مطالعاتی	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالیانه (گیگاوات ساعت)	توضیحات

وضعیت نیروگاه های برق آبی در حال ساخت استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالیانه (گیگاوات ساعت)	سال ورود به مدار	توضیحات



۱-۱۶- مطالعه حریم سواحل دریا ، دریاچه و تالاب های کشور : موردی نداریم

[illegible]



اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح											
ردیف	نام طرح	کد طرح	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار کل سال	پروداختی تا کنون	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)		
									در سال جاری		تا پایان سال قبل متوسط
									برنامه ای	واقعی (تجمعی)	
	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مستمر	مستمر	۴۳۵۰۰۰	۳۷۷۶۸۵	۴۳۵۰۰۰	۴۲۳۱۰۰	۵۰	مستمر	۵۴

۱-۱۸- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلا استفاده (ارقام به میلیون ریال): فاقد عملکرد

وضعیت فیزیکی اموال

نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات

فصل دوم

ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها

۲-۱- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها :

اولویت	کد طرح	عنوان طرح /پروژه	اهداف کمی طرح							درصد تحقق اهداف شهریور ماه ۱۴۰۴ (پیشرفت فیزیکی واقعی)
			کشاورزی	شرب	صنعت	کنترل سیل	زیست محیطی	گذر برق آبی	سایر	
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب										
۲۱	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	بهره برداری و مرمت شبکه های آبیاری و زهکشی پایاپ سدهای چهچه و قره تیکان	۷							۱۰۰.۰
۲۲	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل – دولت اباد شهرستان گلپهار	۷							۴۴.۸
۲۳	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	تأمین آب مشهدازسدکارده (پیش تصفیه و کاهش بارجلبکی)		۷						۹۲.۵
۲۴	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	استفاده بهینه از منابع آب رودخانه شوررود شهرستان میان جلگه	۷	۷						۵۴.۴
۲۵	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	عملیات اجرایی احداث دهانه های آبرگیر رودخانه کپکان – گرنی شهرستان درگز	۷							۵.۹
۲۶	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۷							۱۰.۹
۲۷	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	کانال انتقال آب جمعاب شهرستان چناران	۷							۳۱.۵
۲۸	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبرگیرکشاورزی	۷							۴۰.۱

فصل سوم

مقایسه گزارش حسابرس مستقل

۳-۱- مقایسه گزارش حسابرس مستقل سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل :

تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش		تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل	
سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل
-----	-----	۵	۸

فصل چهارم

وضعیت نیروی انسانی شاغل

۴-۱- نیروی انسانی شاغل :

افزایش (کاهش)	انتهای سال مالی ۱۴۰۳					ابتدای سال مالی ۱۴۰۳					عنوان
	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۱	۳۳	۳۲	۱	۰	۰	۳۴	۳۲	۲	۰	۰	کارکنان خرید خدمت
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	کارگران قرار دادی
۲	۳۳	۳۲	۱	۰	۰	۳۵	۳۲	۲	۰	۱	جمع

تعداد ۲ نفر بازنشسته شدند.

فصل پنجم

فن آوری اطلاعات و

امنیت سایبری زیر ساخت ها

۵-۱- عملکرد اعتبارات بند الف تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۳ - امن سازی زیر ساخت ها: جمع کل عملکرد: ۷۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	خدمات مشاوره تهیه برنامه عملیاتی و تدوین طرح های امن سازی	مشاوره، تحلیل و شناخت وضع موجود تهیه برنامه عملیاتی سه ساله و تدوین طرح های پیشنهادی (شامل ۴ طرح)	۱۰۰٪	کمیته امنیت سایبری	۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	اخذ تأییدیه برنامه عملیاتی و طرح های امن سازی پیشنهادی از مرکز مدیریت راهبردی افتا	تهیه و تدوین برنامه عملیاتی تهیه و تدوین طرح های پیشنهادی (۴ طرح) ارسال برنامه عملیاتی و طرح های پیشنهادی به مرکز افتا خراسان رضوی طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۲۳۱۱۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ اخذ تأییدیه افتا طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۳۴۸۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴	۱۰۰٪	اخذ تأییدیه افتا طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۳۴۸۹/الف/ع مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴	.
۳	ارائه طرح اجرایی، سند RFP و LOM برای طرح اول با عنوان "اصلاح ساختار و معماری شبکه مطابق با استانداردهای جهانی و اجرای الزامات امنیتی"	تهیه طرح جامع مبتنی بر الگوی Cisco SAFE تهیه طرح عملیاتی اختصاصی بر اساس دارایی ها، زیرساخت موجود و نقایض و کمبودها در مقایسه با طرح جامع تهیه و تدوین RFP و ارائه LOM (تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح)	۹۰٪	کمیته امنیت سایبری و تأییدیه مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان رضوی تأمین اعتبار و اخذ مجوز ذیحسابی طرح	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ (پرداخت نشده است)
۴	برنامه ریزی جهت اجرای برنامه کوتاه مدت یک ساله (یک طرح قطعی و طرح دوم در صورت وجود اعتبار) برنامه بلند مدت سه ساله (با پوشش کامل ۴ طرح پیشنهادی)	تأمین اعتبار اجرای طرح اول با عنوان "اصلاح ساختار و معماری شبکه مطابق با استانداردهای جهانی و اجرای الزامات امنیتی"	۱۰۰٪	کمیته امنیت سایبری؛ تأمین اعتبار و اخذ مجوز ذیحسابی طرح	
		تأمین تجهیزات بر اساس LOM پیشنهادی	۱۰۰٪		۷۰۶۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال (پرداخت نهایی)
		مراحل بعدی پروژه: برگزاری استعلام/ مناقصه بر اساس برآورد اولیه و RFP	۸۰٪		

۵-۲- عملکرد اعتبارات در حوزه پدافند سایبری: میزان کل اعتبار:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	اجرای طرح‌های امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی	تهیه و تدوین طرح‌ها، تهیه شرح خدمات و RFP، تهیه LOM، تامین تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای طرح	۸۰٪	مصوبه کمیته امنیت سایبری، تأییدیه طرح افتا	۱۳۱.۴۰۳.۳۶۰.۰۰۰ ریال

۳-۵- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت:

با توجه به اینکه برنامه عملیاتی و طرح‌های پیشنهادی این شرکت طی نامه شماره ۳/۱۱/۲۳۱۱۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ به مرکز افتا خراسان رضوی ارسال گردیده و پاسخ آن مرکز مبنی بر تأیید برنامه و طرح‌های پیشنهادی طی نامه شماره ۳۴۸۹/۱۱/۱۴۰۴/الف/ع مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ اخذ گردید؛ امکان جذب اعتبارات از محل بند (الف) تبصره (۱۱) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خاص طرح‌های مصوب افتا فراهم نگردید.

سایر اعتبارات هزینه شده در حوزه امن‌سازی زیرساخت‌ها از محل اعتبارات جاری در قالب اعتبارات فوق، به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوزها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	جداسازی شبکه OT از IT در بخش کنترل و پایش کنتورهای هوشمند	1. خرید تجهیزات شامل (فایروال، سوئیچ شبکه، سرور، تین کلاینت، تجهیزات پسیو شبکه) 2. اجرای کامل زیرساخت شبکه مجزا 3. نصب، راه اندازی و پیکربندی تجهیزات شبکه و امنیت 4. بهره برداری از پروژه در خردادماه ۱۴۰۴	٪۱۰۰	مصوبه کمیته امنیت سایبری شرکت مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی	۳۰.۰۰۰ میلیون ریال (کل اعتبار هزینه شده با احتساب اعتبارات طرح هزینه شده در سنوات قبل برای خرید تجهیزات) (۷.۳۳۴ میلیون ریال از اعتبارات جاری سال ۱۴۰۳ جهت اجرا و تجهیزات پسیو برق و شبکه)
	پروژه تجهیز مرکز داده پشتیبان به تجهیزات مجازی سازی و پشتیبان گیری	1. نصب و استقرار یک دستگاه سن استوریج EMC در سایت پشتیبان به منظور در دسترس بودن سامانه های حیاتی 2. نصب و استقرار یک دستگاه نس استوریج در سایت پشتیبان به منظور نگهداشت نسخ پشتیبان در خارج از سایت اصلی 3. اجرای بستر ارتباطی (لینک) با سایت اصلی	٪۱۰۰	مصوبه کمیته امنیت سایبری شرکت مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی	تجهیزات در سنوات قبل خریداری گردیده است و قرارداد اجرایی از محل اعتبارات جاری تامین گردیده است

۳-۵- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۳	راه اندازی سیستم اکانتینگ اینترنت	نصب، راه اندازی و پیکربندی یک دستگاه UTM و اعمال سیاست های مدیریت و حسابرسی اینترنت کاربران	٪۱۰۰	مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی	از محل اعتبارات طرح هزینه ای نداشته است. ۳۸۲۸ میلیون ریال از جاری
۴	تهیه و تدوین طرح تداوم کسب و کار (BCP) برای دو سامانه بخش مشترکین (ساماب و حفاظت قدیم)	تهیه و تدوین طرح ها در قالب مستندات پروژه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)	٪۷۰	مصوبات کمیته امنیت سایبری	۰
۵	امن سازی و رفع آسیب پذیری سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی بر اساس ابلاغیه ها و گزارش های آسیب پذیری افتای خراسان رضوی	امن سازی سامانه های اتوماسیون اداری، ایمیل اداری، پرتال سازمان، تدکار، سامیر، کنتورهای هوشمند (سامانه مدیریت مصرف کاوش الکترونیک سپاهان)، سامانه حفاظت و ساماب بر اساس نامه های ارسالی از طرف افتا و شرکت مدیریت منابع آب ایران (دریافت گواهی امنیتی افتا شرکت تدکار) الزام شرکت پایدار تجهیز آتی خراسان در راستای دریافت گواهی افتا جهت سامانه سیماپ	٪۹۰	مصوبات کمیته امنیت سایبری	۰

۵-۳- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۶	راه اندازی زیر ساخت فیزیکی مراکز SOC و NOC در طرح طراحی و ساخت دیتاسنتر شرکت	ساخت اتاق SOC و NOC خرید تجهیزات ویدئووال و مانیتورینگ تدوین طرح SIEM در قالب طرح های افنا	۸۰٪	مصوبات کمیته امنیت سایبری تاییدیه طرح پیشنهادی از سوی مرکز افنا خراسان رضوی	از محل اعتبارات جاری
۷	استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)	تا مرحله ممیزی داخلی و آمادگی جهت ممیزی خارجی	۸۰٪	مصوبات کمیته امنیت سایبری	۰
8	ارتقاء نسخه و تمدید لایسنس آنتی ویروس	ارتقاء نسخه از Advance به EDR Optimum خرید و فعال سازی لایسنس	۱۰۰	کمیته امنیت سایبری	میلیون ریال از جاری ۱۳.۴۹۷
9	طراحی، ساخت و تجهیز دیتاسنتر شرکت	مشاوره و نظارت خرید تجهیزات عملیات اجرایی	۴۰	کمیته امنیت سایبری	۵۰۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات جاری



طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه های آبریز

۵-۴- طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه های آبریز: **نداریم**

میزان کل اعتبار :

میزان کل اعتبار جذب شده :

ردیف	برنامه	اقدامات - عملکرد	درصد تحقق	دستاوردها - نتایج	مبلغ هزینه شده
۱					

فصل ششم

عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد



۶-۱- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد (خارج از شمول) در سال مالی ۱۴۰۳ :

براساس نامه شماره ۵۴۰۰/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	طبقه بندی فصول هزینه				جمع مبلغ
			فصل اول مطالعه و اجراء	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل ششم زمین	فصل هفتم سایر دارائیهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان	
۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیرزمینی سطح استان	۹.۱۴۳				۹۱۴۳
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها	۲۸۵۷				۲۸۵۷
۳	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۸.۰۰۰				۸۰۰۰
		جمع					۲۰۰۰۰

فصل هفتم

معاملات شرکت

۷-۱- معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات مناقصه و مناقصه عمومی و محدود طی سال مالی ۱۴۰۳:

مبالغ به میلیون ریال

نحوه عقد قرارداد	تعداد	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
مناقصه عمومی	۹		۶۸۴۰۶۱۳	۹۲
ترک تشریفات	۱		۲۵۱۵۵۶	۳
مناقصه محدود	---		---	
استعلام	۴		۵۶۷۹۱	۰.۷
سایر قراردادهای مشاوره ای	۱۱		۵۱۷۸۶۵	۷
جمع کل	۲۵		۷۴۱۵۲۶۹	

۲-۷- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۲۴۶۹۰۰۰	۷	۱۳۹۶۵۴۷	
۲	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوریجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۱۳۲۷۱۸۸۴	۳	۳,۵۸۰,۷۳۲	
۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳۲۵۵خ	۱۱۴۰۸۸۰	۶	۱,۳۳۳,۷۸۰	
۴	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوریجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۱۳۲۷۱۸۸۴	۱	۱۴۲,۱۲۲	
۵	اجرای حفاظت و احیای آبهای زیرزمینی	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶خ	۲۲۶۰۰۰	۱	۳۸,۰۰۰	
۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشوراجرای	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۳۵۰۰۰	۱	۴۸,۹۹۰	
۷	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۱۱۶۶۹۱۳	۱	۶۹,۳۸۷	
۸	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشوراجرای - اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶ -- ۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵خ	۶۹۷۰۰۰	۳	۲۱۶,۸۱۵	
۹	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۳۲۵۸۳۲	۱	۱۴,۲۴۰	
جمع:					۶۸۴۰۶۱۳	

۷-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود: (ارقام به میلیون ریال) :
فاقد عملکرد

درصد معاملات نسبت به اعتبار	مبلغ قرارداد	تعداد قرارداد	اعتبار مصوب	شماره طرح	نام طرح	ردیف
				جمع:		

۷-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۲۲۸۰۸	۱	۳۳۶۰	
	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۳۵۰۰۰	۳	۳۲۵۷۱	
	ابرسی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۲۴۶۹۰۰۰	۱	۱۸۷۹۲	
	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۲۴۶۹۰۰۰	۱	۲۰۶۸	
جمع:						۵۶۷۹۱

۷-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار	دلایل ضرورت ترک تشریفات
	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۲۴۶۹۰۰۰	۱	۲۵۱۵۵۶		ضرورت و فوریت کار
جمع:						۲۵۱۵۵۶	

۷-۶- قراردادهای مشاوره: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب میلیون ریال	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
1	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شور یجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۱۳۲۷۱۸۸۴	۵	۲۱۷۵۴۵	
2	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳۲۵۵	۱۱۴۰۸۸۰	۸	۱۱۹۳۹۱	
3	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشور اجرای	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۳۵۰۰۰	۱	۷۴۵۱	
4	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه های آبریز کشور اجرای - اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶ و ۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	۲۶۲۰۰۰+۴۳۵۰۰۰	۱	۵۲۹۷	
5	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۳۲۵۸۳۲	۳	۱۰۶۱۹۸	
6	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۲۴۶۹۰۰۰	۲	۲۸۷۸۳	
7	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۴۴۶۲۸۲	۱	۵۶۲۲	
8	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۱۱۶۶۹۱۳	۱	۹۸۸۰	
9	اجرای حفاظت و احیای آبهای زیرزمینی	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	۲۲۶۰۰۰	۱	۵۳۴۷	
10	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه های مرزی خراسان رضوی	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	۶۵۰۰	۱	۹۹۲۷	
11	نگهداری و پشتیبانی سیستم نرم افزار ذیحسابی			۱	۲۴۲۴	

فصل هشتم

تكاليف مجمع عمومي سال قبل

۱-۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

عمومی مجمع شماره بند	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۲	با توجه به یادداشت های توضیحی ۱-۵ ، موجودی کالا از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد. پوشش بیمه قرار گرفته است. در این رابطه ضروری است مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد ۱۳۹۸ مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی بر پوشش بیمه ای دارائی ها به ارزش کارشناسی مورد توجه قرار گیرد . اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .	شرکت موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور ، و زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کارشناسی را فراهم کند
۳	نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخصوص قانون محاسبات عمومی ، برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان ، بودجه ، و ضوابط اجرایی و قوانین پنجساله اقدام نماید. در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی مبنی بر ارائه صورتهای مالی در مهلت مقرر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی به نحوی برنامه ریزی نماید تا صورتهای مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۱۴۰۳ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می گردد با انضمام گزارش عملکرد دوره مذکور را در موعد مقرر تهیه و به مجمع عمومی و سایر مراجع ذیربط ارائه نماید. رعایت مفاد ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی انجام شود. نسبت به بارگزاری اطلاعات در سامانه های مختلف کشور بخصوص سامانه اطلاعات یکپارچه شرکتهای دولتی و پایگاه اطلاعات قراردادهای اقدام نماید. نسبت به بارگزاری اطلاعات در سامانه های مختلف کشور بخصوص سامانه اطلاعات یکپارچه شرکتهای دولتی و پایگاه اطلاعات قراردادهای اقدام نماید.	با توجه به اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی و استاندارد ها که ناگزیر به شناسایی وضعیت پیمانکاران در دفاتر ذیحصاسبی بوده و نیز منابع محدود دولت ، متأسفانه در سنوات اخیر تخصیص کمتر از بودجه مصوب ابلاغی بوده است، لذا موجب تاخیر در واریز بخشی از سپرده های پیمانکاران به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه، به مبلغ ۳۳۹۹۳۸ م ریال تا آخر سال ۱۴۰۲ شده است. بدیهی است با ساز و کار اجرایی و مکانیزم پرداخت ها بصورت اسناد خزانه و اوراق تسویه، تمام تلاش و کوشش این شرکت بر رعایت کامل مفاد قانونی یاد شده می باشد. شایان ذکر است مطالبات برخی از پیمانکاران در پروژه های بزرگ چند برابر پرداختی به ایشان می باشد . صورت های مالی ذیحصاسبی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تهیه و در همین تاریخ و با کد پیگیری ۲۵۱۵۰۳۷۰۳/۲۰ و شماره نامه ۶۰/۱۷۵۸۰ س در سامانه سناما ثبت گردیده است. صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای تعهدی تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شماره ۱۴۰۳/۷۴۷۷۳/۱۱/۲ به سازمان حسابرسی ارائه شده است. متأسفانه فرایند اجرای سامانه به این شکل است که باید ابتدا گزارش حسابرس بارگزاری گردد و بعد از آن اطلاعات طرح ها. این فرایند مغایر با متن صریح قانون که مهلت بارگزاری اطلاعات را تا آخر شهریور اعلام کرده است ، می باشد. اطلاعات سال مالی ۱۴۰۲ نیز در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ بالاافاصله پس از اخذ گزارش حسابرس و بارگزاری این گزارش در سامانه ثبت و تاییدیه سه ماهه سوم و چهارم و کل سال اخذ شده است. تمامی قراردادهای این شرکت در سال ۱۴۰۳ در پایگاه اطلاعات قرارداد ها ثبت شده و دارای شناسه قرارداد از پایگاه می باشد. اما خروجی اکسل پایگاه اطلاعات قراردادها در سال ۱۴۰۳ دارای مغایرت بوده و تعداد قراردادهای ثبت شده را کمتر از قراردادهای نمایش داده شده گزارش داد. در سال جاری این مشکل برطرف شد.

۸- ۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

عمومی مجمع ۰ ش بند تجلیس	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۴	شرکت موظف است در قالب ساختار ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقایی شرکت مادر تخصصی نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری به دفتر مذکور اقدام نماید.	بند الف ماده ۲۰ قانون یاد شده شرکت خرید خارجی نداشته است. طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صورت وضعیت تایید شده که به ذیحسابی میرسد اگر اعتبار نداشته باشد بصورت تعهدی مالیات عوارض و ارزش افزوده و بیمه و سپرده حسن انجام کار شناسایی تا در زمان وجود اعتبار پرداخت گردد. در صورتی هم که اعتبار نقدی داشته باشد به محض دریافت صورت وضعیت موارد بالا شناسایی و پرداخت می گردد. بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده اشاره به استفاده از توان تولیدی و داخلی کشور در خرید و قراردادهای پیمانکاری دارد که شرکت موارد را رعایت نموده و گزارش آن را طی ۲ نامه در دوره های شش ماهه سال قبل به ساتکاب ارسال شده بود. در سال ۱۴۰۳ در دوره های سه ماهه طی مکاتبه های شماره ۲۰۷-۱۸۰۹-۱۲۶۱۸ و ۶۱۸۵ ارسال شد.
۵	درخصوص آندسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آنها شرکتهای آب و فاضلاب استان می باشد در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۲۰-۶-۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و آیین نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰-ت-۵۹۳۶۳ ه مورخ ۱۹-۵-۱۴۰۱ هیات محترم وزیران اقدام نماید.	دو خط انتقال یاد شده در سال ۹۶ طبق توافق بعمل آمده و دستورات ابلاغی به شرکت آب و فاضلاب مشهد واگذار گردید. گزارش های مربوط به انتقال حساب دو طرح "خط انتقال آب از سد دوستی و ارداک به مشهد" در فرمت استاندارد ابلاغی تهیه و مبالغ ریالی آن مشخص گردیده است. این گزارشها به همراه سایر مستندات برای شرکت آبفای مشهد ارسال شده است. اختلافاتی در خصوص مستندات اراضی مطرح شده که دفاتر حقوقی طرفین در حال بررسی آن هستند.
۶	پیگیری کامل برای تخصیص اعتبار، گزارش جامع از آخرین وضعیت طرح ها و پروژه ها، تهیه توجیهات در خصوص تاخیرات و پیگیریهای مربوط به تعیین تکلیف طرح های راکد و غیر فعال و فاقد تخصیص انجام شود	طبق ماده ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه سال بعد بوده لذا اعتبارات ذکر شده (یادداشت توضیحی ۳) در مهلت مقرر (پایان شهریور ماه ۱۴۰۳) به مصرف رسیده است. از محل منابع داخلی به شرح جدول زیر جمعا به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده بود که عملکردی نداشته است.

فصل نهم

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

۹-۱- برنامه عملیاتی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل :

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		واحد	توضیحات
		پیش بینی	انجام شده		
۱	تشکیل ستاد مدیریت شرایط اضطراری بصورت ماهانه	۱۲	۱۰	جلسه	دستور جلسات: هماهنگی سیلاب، مدیریت سیلاب، آماده باش سیلاب، ارائه مطالعات شکست سد تبارک، آماده باش سیلاب، برنامه ریزی هفته پدافند، تشدید اقدامات حفاظتی، امنیتی، پدافندی، ارائه مطالعات شکست و پدافند سدها
۲	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	۴	۱۱	مانور	مانور سراسری آماده به کاری مولدهای برق اضطراری، رزمایش تمرینی آموزشی مدیریت بحران وزارت نیرو منطقه شمال شرق کشور، مانور تست عملکرد سیستم های اعلام و اطفاء حریق امورها، مانور مشترک امداد و نجات با آتش نشانی مشهد، مانور بازگشایی دریاچه سدها، مانور پایش سدبار از نظر بیماری های مشترک انسان و پرندگان
۳	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند های ۱ و ۲ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور	۲۰۳۰۰۰	۲۰۳۰۰۰	میلیون ریال	هزینه کرد اعتبارات، از سرجمع اعتبارات طرح های عمرانی می باشد و فاقد کد طرح می باشد.
۴	برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE	۱۲۰۰	۹۰۴	نفر ساعت	دوره های هوش مصنوعی، هلال احمر، اطفاء حریق
۵	ارائه گزارش اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ غ تأیید شده	۷	۷	گزارش	مطالعات بررسی و ارتقا زیر ساخت های ارتباطی سدهای طرق، کارده و ارداک، حفاظت هوشمند سدهای تبارک و بار، خرید و نصب دستگاه زیست سد تبارک، تامین و خرید مولد برق اضطراری، دوره های آموزشی تخصصی پدافند سایبری، زیستی، شیمیایی و ...، برگزاری رزمایش تخصصی پدافند سایبری، زیستی، شیمیایی و ..
۶	اطلاع رسانی اولیه پیامکی حوادث و اتفاقات و ارسال گزارش های تکمیلی براساس گردش کار ابلاغی	۳۰	۳۰	مورد	هشدارهای بارش و سیلاب
۷	استقرار و تجهیز اتاق مدیریت بحران	۲۵	۲۵	واحد	تهیه لوازم مورد نیاز در سیل شامل جلیقه نجات، حلقه نجات، تابلو ایست، لباس بحران
۸	اجرای مفاد نظام نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	۲۰	۲۰	اقدام	تشکیل جلسات ستاد، اطلاع رسانی فوری مخاطره سیلاب، پیگیری اجرای اقدامات پیشگیرانه
۹	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	۳۰۰	۲۴۰	نفر	اجرای طرح پایش سلامت کوهورت برای نیروهای رسمی و پیگیری اجرای طرح پایش سلامت برای نیروهای شرکت توسط شرکت های طرف قرارداد
۱۰	بیمه اموال بیمه پذیر (تاسیسات و ساختمان های شرکت) مطابق بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور	-	۱۹۹۳.۷	میلیارد ریال	بررسی قراردادهای بیمه ای در تاسیسات و ساختمان ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روش ها
۱۱	شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تاسیسات آبی	-	-	عدد	تشکیل جلسات ستاد، اطلاع رسانی فوری مخاطره سیلاب، پیگیری اجرای اقدامات پیشگیرانه
۱۲	اجرای برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی	۱۳	۱۰	مورد	اجرای طرح پایش سلامت کوهورت برای نیروهای رسمی و پیگیری اجرای طرح پایش سلامت برای نیروهای شرکت توسط شرکت های طرف قرارداد
۱۳	ارائه گزارش عملکرد سالانه دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران	۱	۱	گزارش	تدوین الزامات و ابلاغ از طریق مکاتبه در اتوماسیون اداری و پیام رسان داخلی

۹-۲- گزارش هزینه کرد بند (۱) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شماره طبقه‌بندی دستگاه	عنوان دستگاه	عنوان پروژه‌های مندرج در موافقت نامه ۱۴۰۳	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	منبع تأمین اعتبار (پیوست شماره ۱، ردیف‌های متفرقه و ..)	میزان اعتبار هزینه شده
۱		شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	حفاظت هوشمند سدهای مهم استان		حفاظت هوشمند سدهای مهم استان	مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، محل هزینه کرد از اعتبارات پدافند غیرعامل و از سرجمع اعتبارات طرح های عمرانی می باشد. بنابراین فاقد کد طرح مشخصی است.	۵۵,۰۰۰
۲		شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	پدافند سایبری		اتاق سرور ساختمان مرکزی	مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، محل هزینه کرد از اعتبارات پدافند غیرعامل و از سرجمع اعتبارات طرح های عمرانی می باشد. بنابراین فاقد کد طرح مشخصی است.	۱۴۸,۰۰۰

فصل دهم

حقوقی

۱۰-۱- تعداد دعاوی مطروحه علیه شرکت واقدامات انجام شده برای حل و فصل آن در سال ۱۴۰۳:

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دعادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
—	۲۹	۵	۶۱	۹۵	سال قبل	دعوی مطروحه علیه شرکت
—	۲۰	۶	۹۴	۱۲۰	سال مورد گزارش	
—	۴۴	۲۱	۷۵	۱۴۰	سال قبل	دعوی مطروحه توسط شرکت
—	۲۴	۷	۹۴	۱۳۵	سال مورد گزارش	

۱۰-۲- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۳ :

نام شرکت	پرونده		جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
	حقوقی	کیفری			له	علیه			
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	۴۶۷	۲۲۸	۴۸۱	۲۳۴	۴۳۷	۳۸	۲۲۰۴	۷۵۹	۱۹۸۲۴

۱۰-۳- اخذ سند مالکیت :

بستر سایر پیکره‌های آبی (اعم از مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی)			بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها)			اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار		
اخذ سند تک برگي (هکتار)			اخذ سند تک برگي (هکتار)			اخذ سند تک برگي (هکتار)		
کل مساحت (هکتار)	طول آبراهه ها (کیلومتر)	مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)	کل (از زمان فعالیت شرکت)			کل (از زمان فعالیت شرکت)		
			۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۱۵	۰	۸۷	۳۹۲	۱۷۳	۱۲۷۵	۵۰۰	۱۴۶۷۷	۱۰۸۰۰

۱۰-۴- : اطلاعات مربوط به پرونده های کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از ابتدا تاکنون:

ردیف	شرکت آب منطقه‌ای	تعداد شکایات ثبت شده				تعداد آرای صادر شده کمیسیون								تعداد آرای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری							
		فرم یک	فرم پنج	سایر	جمع	فرم یک		فرم پنج		سایر		جمع		فرم یک		فرم پنج		سایر		جمع	
						له	علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه
۱	خراسان رضوی	۴۲۳	۱۷۰۷	۱۳۸۴	۳۵۱۴	۹۱	۱۵۹۶	۹۷	۱۰۹۲	۹۱	۲۹۷	۳۰۱۶	۱۱۷	۵۱	۱۳۸۹	۱۰۷	۱۵۹	۵	۲۳۹۶	۲۳۰	۲۳۰
	مجموع	۴۲۳	۱۷۰۷	۱۳۸۴	۳۵۱۴	۹۱	۱۵۹۶	۹۷	۱۰۹۲	۹۱	۲۷۹	۳۰۱۶	۱۱۷	۵۱	۱۳۸۹	۱۰۷	۸۹۰	۷۲	۲۳۹۶	۲۳۰	۲۳۰

فصل یازدهم

امور اجتماعی و روابط عمومی

۱۱-۱- برنامه عملیاتی دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی، پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی

ردیف	مخاطب برنامه	وزن (درصد)	واحد	هدف	عملکرد تأییدی
۱	نشست ها، جلسات، همایش ها و کنفرانس های مطبوعاتی	۲۰	نشست	۳۳	۴۰
۲		۳	تعداد	۳۳	۳۵
۳		۵	برنامه	۲	۲
۴		۵	برنامه	۳	۳
۵		۳	برنامه	۱۵	۱۵
۶		۲	جلسه	۱	۲
۷		۲	جلسه	۱	۱
۸		۱	جلسه	۰	۱
۹		۲	جلسه	۱	۱
۱۰		۱	جلسه	۱	۱
۱۱		۲	جلسه	۱	۱
۱۲		۲	جلسه	۱	۱
۱۳		۲	جلسه	۱	۱
۱۴		۲	جلسه	۱	۱
۱۵		۲	جلسه	۱	۱
۱۶		۲	جلسه	۱	۱
۱۷		۵	جلسه	۲	۳
۱۸		۳	جلسه	۲	۲
۱۹		۴	کنفرانس مطبوعاتی	۲	۲
۲۰		۱۰	برنامه	۶	۶
۲۱		۲	تعداد	۵۰	۷۱
۲۲		۲۰	دانش آموز	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	فعالیت های خلاقانه و نوآورانه استان (بومی)		درج * به معنای تأیید است.	۵۰ درصد	
۲۴	درصد پیشرفت پروژه با احتساب امتیاز خلاقیت و نوآوری			۹۰	

فصل دوازدهم

چالشها ، مشکلات و پیشنهادات

مشکلات و موانع فرا روی طرح / پروژه های تامین آب و آبرسانی

چالش: محدودیت شدید منابع اعتباری در طرح های ابی از جمله " تامین آب (شرب و بهداشت) مشهدالرضا و استان "

پیشنهادهات:

۱- لزوم تامین و تخصیص اعتبارات طرح های اضطراری تامین آب (شرب و بهداشت) با استفاده از منابع اعتباری مختلف (مدیریت بحران / درآمدهای اختصاصی وزارت نیرو و.....)

۲- افزایش و تخصیص اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ طرح "ساختمان سد و سامانه انتقال آب شوریجه" به ۱۶.۵۳۰ میلیارد ریال

از محل اعتبارات "رودخانه مرزی-صندوق توسعه ملی"

مشکلات و موانع فرا روی طرح / پروژه های تامین آب و آبرسانی

۳- لزوم تسريع در اصلاح ماده (۲۳) ق. الحاق برخی مواد به ق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در طرح

" تامین آب (شرب و بهداشت) مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد "

* افزایش سهم اعتبارات درآمد عمومی از ۱۰ به ۶۷ درصد

• کاهش سهم اعتبارات منابع داخلی از ۹۰ به ۳۳ درصد

با تاکید بر تامین اعتبار از منابع اعتباری رودخانه مرزی - صندوق توسعه ملی

۴- لزوم اصلاح ماده (۲۳) ق. الحاق برخی مواد به ق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در:

- طرح " تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با چاههای کشاورزی "

۵- تعیین تکلیف قانونی طرح تامین آب (شرب و بهداشت) مشهد استان خراسان رضوی از دریای عمان

مشکلات و موانع فرا روی طرح / پروژه های تامین آب و آبرسانی

۶- ارائه پیشنهاد لایحه از هیات محترم دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام چاههای کشاورزی به استفاده از پساب در آبخوان های مهم و تامین کننده آب (شرب و بهداشت)

۷- لزوم تامین اعتبار لازم خرید چاه جهت تامین اب (شرب و بهداشت) با استفاده از ظرفیت قانونی لایحه " تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت " مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

۸- لزوم پیش بینی اعتبار در فصل ششم (زمین) در موافقتنامه طرح " ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی اب " برای شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و تعیین تکلیف نهایی ساز و کار های قانونی در نحوه پرداخت حق ارتفاق اجرای خطوط انتقال اب در اراضی زراعی

مشکلات و موانع فرا روی طرح / پروژه های تامین آب و آبرسانی

و سایر :

لزوم بازنگری در نحوه سرمایه گذاری شرکت های آب و فاضلاب در موضوع پساب

تدوین بسته های تشویقی برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسان فنی (از جمله تداوم امتیاز همترازی مدیران طرح ها)

ضعف فنی و مالی مشاوران و پیمانکاران بعلت عدم تخصیص بموقع اعتبارات جهت پرداخت حق الزحمه خدمات و مهاجرت نخبگان و عدم تمایل کارشناسان خبره به فعالیت در این شرکت ها

عدم شفافیت در نحوه تامین اعتبار طرح های عمرانی و عدم تمایل شرکت های پیمانکاری به شرکت در فرایند مناقصات

پیوست‌ها

پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار از منظر تامین منابع مالی

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۴	هزینه شده تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اعتبار مورد نیاز(*)	اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴	اعتبار تخصیص یافته سال ۱۴۰۴
۱	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	۴.۸	۵.۴۹۳.۶۴۸	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۹۶.۰۰۰
۲	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوربجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۸۲.۷۴	۱۷.۷۶۷.۳۴۱	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۳۰.۰۰۰	۳.۰۱۷.۵۴۲
۳	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۴۳.۴	۱.۸۹۹.۵۳۸	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۱
۴	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۴۸.۱۵	۱.۰۶۱.۰۱۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲۴.۹۳۱
۵	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	۶۶.۳۱	۱.۲۲۳.۹۲۶	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۴.۲۸۶
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب							
۶	سامانه آبیگر شناور سد مخزنی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۰.۶۸	۸۶۵.۰۰۰	---	---	---
۷	حفاری چاههای تامین آب مشهد از آبخوان مشهد	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۸۵.۹	۳.۷۹۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	--	--
۸	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۳۷.۳۴		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰۰.۰۰۰
۹	ابرسانی از سد تبارک به شهر قوچان	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۷	۱.۶۶۸.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۸۵.۵۰۰	۸۵.۵۰۰
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور							
۱۰	عملیات ساماندهی ساماندهی رودخانه کلات (در محدوده شهری - مرحله (۲)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۹۷.۲	۱۸۳.۸۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۴۹۲.۲۲۵	۶.۰۰۰
۱۱	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۸۱.۶۴	۵۵۲.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۲.۰۰۰	۴۲.۰۰۰

پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمان بندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۴		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
۱	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد	۱۳۰۷۰۰۳۳۱۴	۴۰۸۸	۴۰۸۸	مشکلات تامین اعتبار
۲	اجرای خط انتقال آبخوان غرب به شهر مشهد	سرمایه گذاری	۶۹	۱۰۰	مشکلات اجتماعی
۳	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شور یچه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۹۹۰۰۴	۸۲۰۷۴	مشکلات اجتماعی
۴	آبرسانی به شهرهای نیشابور و فیروزه از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۴۳۰۰۴	۶۲۰۸۵	عدم تامین اعتبار
۵	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۴۸۰۴۵	۴۹۰۸۵	عدم تامین اعتبار
۶	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	۶۶۰۳۱	۸۰۰۷۵	عدم تامین اعتبار



پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمانبندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۴		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب					
۷	سامانه آبیگر شناور سد مخزنی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۰.۶۸	۱۰۰	عدم شرکت مناقصه گران
۸	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان غرب	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۸۲.۷	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۹	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۳۷.۵	۶۵	عدم تامین اعتبار
۱۰	آبرسانی از سد مخزنی تبارک به شهر قوچان	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۷	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۱۱	تاسیسات پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی آب سد مخزنی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۶.۰۱	۱۰۰	عدم تامین اعتبار



پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمان بندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۴		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور					
۱۲	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۷۵.۶	۹۹.۵	عدم تامین اعتبار
۱۳	ساماندهی رودخانه کلات در محدوده شهری - مرحله (۲)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۶۴.۴	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
طرح تامین زیر ساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی					
۱۴	آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (۵) شهرستان مشهد	۱۳۰۴۰۱۲خ۱۰۲	۱۹.۱۵	۵۰	عدم تامین اعتبار
طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی / پروژه : تغذیه سفره های آب زیر زمینی					
۱۵	بهسازی، ترمیم و افزایش کارایی (راندمان) تغذیه مصنوعی شاندیز	۱۳۷۰۰۶خ۶۶۶	۸۶.۶	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۱۶	ساماندهی سازه های تغذیه مصنوعی فاروب	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	۹۰	۱۰۰	عدم تامین اعتبار

پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمانبندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۴		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب					
۱۷	کانال انتقال آب جمعاب شهرستان چناران	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۴۱.۲	۷۴.۲۳	مشکلات اجتماعی و اعتباری
۱۸	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبیگر کشاورزی شرخس	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۴۹.۱۴	۷۴	عدم تامین اعتبار
۱۹	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۱۴.۶۶	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۲۰	عملیات اجرایی احداث دهانه های آبیگر رودخانه کپکان - گرنی	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۶.۰۵	۷۸	مشکلات اجتماعی ، عدم تامین اعتبار
۲۱	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل - دولت آباد	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۳۷.۶۰	۳۹.۵	مشکلات شدید اجتماعی
۲۲	احداث سازه آبیگر و اجرای خط انتقال رواناب رودخانه شوررود	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۵۸.۰۴	۹۳.۱۶	مشکلات شدید اجتماعی و اعتبارات
اجرای ساماندهی رودخانه ها					
۲۳	عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه حمام قلعه در محدوده روستای ژرف	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۰۵	۱۰۰	۱۰۰	وجود مطالبات و عدم تامین اعتبار
۲۴	ساماندهی رودخانه کلات در محدوده شهری - مرحله (۱)	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۰۵	۱۰۰	۱۰۰	وجود مطالبات و عدم تامین اعتبار

اطلاعات تکمیلی طرح ها

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۳	تا پایان اذر ماه
۱	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد *	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۲	۱	۷	--	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۴۰۷	۸.۳۵۸.۳۴۹	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۹۷.۶۴۸	۵.۴۹۳.۶۴۸	۳۰.۲	۵.۱۸
۲	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شور یچه	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۸	۲	۷	--	۱۳۸۸	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۹.۹۲۶.۲۱۶	۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۴۹.۷۹۹	۱۷.۷۶۷.۳۴۱	۶۵.۹۹	۸۲.۷۴
۳	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۳۰	--	۷	--	۱۳۹۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۲.۵۹۵.۸۳۷	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۹۵.۸۳۷	۱.۸۹۹.۵۳۸	۴۱.۸۶	۴۳.۴
۴	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۶	--	۷	--	۱۳۸۹	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱.۳۹۳.۳۹۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۳۶.۰۸۰	۱.۰۶۱.۰۱۱	۴۶.۸۶	۴۸.۱۵
۵	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۴	--	۷	--	۱۳۷۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱.۴۱۷.۷۳۶	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۱۹.۶۴۰	۱.۲۲۳.۹۲۶	۶۵.۸۹	۶۶.۳۱



 در سال ۱۴۰۲ اعتبار آن در موافقت نامه شهرهای دارای تنش آبی دیده شده ولی بدلیل عدم مجوز کمیسیون ماده (۲۳) فاقد تخصیص و ابلاغ اعتبار می باشد. طبق نامه ابلاغ شماره ۱۴۰۱/۱۰/۱۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ معاونت محترم آب و آبفای وزیر از محل منابع داخلی مبلغ ۳۶۸ میلیارد ریال و از محل بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال شده است.


۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		بر آورد هزینه (موافقت نامه)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۳	تا پایان اذر ماه ۱۴۰۴
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب													
۶	سامانه آبیگر شناور سد دوستی	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۰۴۳	--	۷	--	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۴	-----	۸۶۵.۰۰۰	۸۶۵.۰۰۰	۸۰.۹۳	۹۰.۷
۷	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال (۲۵) حلقه چاه	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۰۴۳	--	۷	--	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۵	--	۳.۷۹۰.۰۰۰	۲.۷۹۰.۰۰۰	۷۶.۱۶	۸۲.۷
۸	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال (۵۰) حلقه چاه	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۰۴۳	--	۷	--	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۵	--	۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۴	۳۷.۳۴
۹	تاسیسات پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی آب سد مخزنی	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۰۴۳	--	۷	--	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۱۴۰۴	--	۳۹۱.۸۸۵	۲۹۵.۸۸۵	۸۵.۵	۹۶.۰۱



ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاع ی	غیر انتفاع ی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۳	تا پایان اذر ماه ۱۴۰۴
10	تامین وانتقال آب در حوزه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	--	--	۷	متمركز	--	متمركز	--	--	متمركز	--	--	ادامه دار
مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور														
۱۱	عملیات ساماندهی رودخانه مرحله دو (در محدوده شهری کلات)	۱۳۹۰۵۲۴۶۰۰۰۸	--	--	۷	متمركز	--	متمركز	۱.۳۶۸.۵۷۹	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۸۰۰	۱۸۳.۸۰۰	۸۷.۷	۹۷.۲
12	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود	۱۳۹۰۵۲۴۶۰۰۰۱	--	--	۷	۱۳۹۰	۱۴۰۵	۱۴۰۵	--	۷۵۰.۰۰۰	۵۴۷.۵۰۰	۵۵۲.۵۰۰	۷۵.۶	۸۱.۶۴

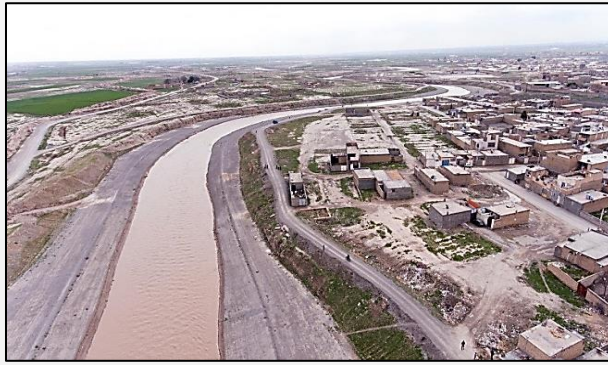

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۳	تا پایان اذر ماه ۱۴۰۴
طرح های دارای دیون / ساختمان سد و شبکه آبیاری – زهکشی														
۱۳	چهچه	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۱۴۸	۲	√	--	۱۳۸۵	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۷۹۰.۹۷۳	۱۶.۶۵۶	۷۷۴.۳۱۷	۷۹۰.۹۷۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	سررود (قره تیکان)	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۱۴۶	۲	√	--	۱۳۸۵	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱.۵۱۰.۴۷۸	۲۶۰.۳۳۰	۱.۱۹۳.۵۶۵	۱.۲۲۱.۵۶۵	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	زنگلانو (آبیورد)	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۰	۲	√	--	۱۳۸۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۲.۵۸۵.۷۳۴	۱۸۰.۰۰۰	۲.۳۵۴.۹۶۸	۲.۳۷۹.۹۶۸	۹۹.۲۶	۹۹.۲۶
۱۶	شبکه آبیاری – زهکشی دوستی	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۲۰۹	۱	√	--	۱۳۷۵	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱.۷۸۳.۷۶۹	۱.۹۵۹.۷۷۴	۱.۷۸۳.۷۶۹	۱.۷۹۱.۷۶۹	۱۰۰	۱۰۰



۱-۲-۶- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (استانی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		بر آورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه شده تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۳	تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴
اجرای ساماندهی رودخانه ها													
۱۷	اجرای ساماندهی رودخانه کشف رود و سیاستک	۶۰/۱۳۹۰۵۲۴۶۰۰۱	--	--	۷	۱۳۹۰	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۴۰۰.۰۰۰	۲۷۳.۴۶۷	۲۸۸.۸۶۷	۷۵.۶	۸۱.۶۴
۱۸	لا بروبی و ساماندهی رودخانه کلات	۱۳۹۰۵۲۴۶۰۰۸	--	--	۷	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۸۰۰	۱۸۳.۸۰۰	۸۷.۷	۹۷.۲
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب													
۱۹	تامین آب شرب مشهد از کارده (پیش تصفیه کارده و کاهش بارچلیکی)	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۲۹۵.۸۸۵	۳۹۱.۸۸۵	۴.۴۸۷.۸۸۵	۸۵.۵	۹۶.۰۱
۲۰	بهره برداری بهینه از منابع آب (سردخانه های رودخانه کپکان - گرني) شهرستان درگز	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۵۵۰.۰۰۰	۳۸.۲۶۲	۰	۲	۶.۰۵
۲۱	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۴۳۲.۰۰۰	۲۱.۹۳۱	۳۱.۹۳۱	۰	۱۴.۷
۲۲	کانال انتقال آب جمعب شهرستان چناران	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۳۶۵.۰۰۰	۸۴.۸۵۵	۸۴.۸۵۵	۱۲.۲	۴۱.۲
۲۳	احداث و اصلاح کانال انتقال آب اراضی پایاب سدهای چهچه و قره تیکان	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۷۴.۹۳۷	۱۵۴.۹۳۷	۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبگیر کشاورزی سرخس	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۳۴۰.۰۰۰	۶۸.۸۴۲	۶۸.۸۴۲	۲۰.۰۱	۴۹.۱۴
۲۵	استفاده بهینه از رواناب رودخانه شور رود	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۹۰۰.۰۰۰	۳۵۳.۱۸۹	۳۵۳.۱۸۹	۴۷	۵۸.۰۴
۲۶	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل - دولت اباد	۶۰/۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۱	--	--	۷	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۶۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۰	۳۷.۶

۱-۲-۶- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (استانی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه ای)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع دریافتی تاکنون	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۳	تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴
طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی / پروژه : تغذیه سفره های اب زیر زمینی													
۲۷	ساماندهی تغذیه مصنوعی فاروب رومان	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۶۰،۹۳۶	۵۰۰،۰۰۰	۳۲،۲۹۶	۸۸،۷	۹۵،۱۵
۲۸	تغذیه مصنوعی شاندیز	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۵۸،۲۷۲	۵۰۰،۰۰۰	۲۹،۰۲۷	۱۰۰	۱۰۰



۱-۲-۷- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی ، استانی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۳	تا پایان اذر ماه ۱۴۰۴
۱	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۳۰	--	۷	--	۱۳۹۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۲.۵۹۵.۸۳۷	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۷.۰۱۱	۴۱.۸۶	۴۳.۴
۲	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۶	--	۷	--	۱۳۸۹	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱.۳۹۳.۲۹۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۱.۰۱۱	۴۶.۸۶	۴۸.۱۵
۳	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۴	--	۷	--	۱۳۷۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱.۴۱۷.۷۳۶	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۲۳.۹۲۶	۶۵.۸۹	۶۶.۳۱



**ارائه گزارش عملکرد نحوه استقرار نظام نامه
حاکمیت شرکتی و تشکیل جلسات کارگروه های
مربوطه از جمله کارگروه حسابرسی، مدیریت
ریسک و انتصابات و جبران خدمت**

کمیته حاکمیت شرکتی

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	محمد علی نعمت نژاد	رئیس و عضو کمیته	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
		۲	علیرضا عامری	نایب رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل
		۳	فیروزه یحیی زاده	دبیر و عضو کمیته	رئیس حسابرسی داخلی و عضو اصلی هیات مدیره
			محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و عضو اصلی هیات مدیره
		۴	غلامرضا ممدوحی	عضو کمیته	معاون حفاظت و بهره برداری و عضو اصلی هیات مدیره
		۵	حسین پور اول	عضو کمیته	معاون طرح و توسعه و عضو اصلی هیات مدیره
		۶	مجتبی برغمندی	عضو کمیته	معاون برنامه ریزی و عضو علی البدل هیات مدیره
		این کمیته مطابق دستورالعمل ابلاغی در سال ۱۴۰۳ تشکیل گردید. ۳ جلسه در سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.			



امور مجامع		اعضاء هیات مدیره		مصوبات هیات مدیره	بخش عمومی	کمیته ها	یادداشت	
درج اقدامات	سوابق اقدامات	شرکت	دوره مالی	نوع	ردیف	بند	جزء	خلاصه بند حسابرص
		۴۲۰	۱۴۰۳	جاری - هزینه ای	۱۱	۱۱۰ ۱۰ و ۱۲		اجرای آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری
		۴۲۰	۱۴۰۲	جاری - هزینه ای	۱۱	۱۱		مسئولیت های حسابرص و بازرس قانونی در حسابرصی صورتهای مالی
		۴۲۰	۱۴۰۱	جاری - هزینه ای	۱۲	۱۲		مسئولیت های هیأت مدیره در قابل صورتهای مالی
		۴۲۰	۱۴۰۳	جاری - هزینه ای	۱۲	۱۱۰ ۱۰ و ۱۲		رعایت کامل مفاد ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور
		۴۲۰	۱۴۰۱	جاری - هزینه ای	۱۳	۱۳		مسئولیت های حسابرص و بازرس قانونی در حسابرصی صورتهای مالی
		۴۲۰	۱۴۰۳	جاری - هزینه ای	۱۳	۱۱۰ ۱۰ و ۱۲		رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور را به حسابرص مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
		۴۲۰	۱۴۰۳	جاری - هزینه ای	۱۴	۱۱۰ ۱۰ و ۱۲		در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی خاتمه یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره ۱۰۰/۲۷۹۹۶/۴۰۳ مورخ ۳۰/۴/۴۰۳ وزیر محترم نیرو را بعمل آورد.

کمیته حسابرسی داخلی

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	غلامرضا ممدوحی	عضو کمیته	معاون حفاظت و بهره برداری
		۳	محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
		۴	مجتبی برغمندی	عضو کمیته	معاون برنامه ریزی
		۵	مهران خجسته	عضو کمیته	مدیر مالی و ذیحساب جاری
		۶	علیرضا کریمی	عضو کمیته	رئیس اداره حسابداری
		۷	فیروزه یحیی زاده	دبیر کمیته	رئیس گروه حسابرسی داخلی و عضو علی البدل هیات مدیره
تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲: ۲۲ جلسه					
تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۳: ۲۲ جلسه					
در سال جاری اعضا تغییر کردند. آقای عامری (رئیس کمیته)، خانم یحیی زاده (دبیر و عضو) و اعضاء: خانم رنجبر و آقایان توجکی، مطهری نژاد، تارکی، کریمی و میرانی					

کمیته ریسک

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر/ اعضای کمیته/ واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	امیر گرد نوشهری	عضو کمیته	مدیر تحول اداری و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
		۳	سید مجید حسینی	عضو کمیته	کارشناس طرح ها
		۴	سمانه عاملی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
		۵	رضا براتی	عضو کمیته	رئیس گروه تحقیقات کاربردی
		۶	کیوان کرباسی	عضو کمیته	کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
		۷	محمد رشیدی	دبیر کمیته	رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
		این کمیته در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد. مجدداً در سال ۱۴۰۳ اعضا به شرح یاد شده منصوب گردیدند. ۵ جلسه در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده است.			
برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در حال تنظیم شرح خدمات قرارداد می باشد.					

کمیته انتصابات

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	نایب رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
		۳	سمانه عاملی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
		۴	مدعو	عضو مدعو	معاون مربوطه
تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳: تعداد ۴ جلسه					



گزارش در ارتباط با اجرای مفاد آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت

خلاصه وضعیت برنامه مولد سازی اراضی - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

ردیف	نام ملک	مساحت (متر مربع)	ارزش برآوردی سال ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)	روش ارزش افزایی پیشنهادی	وضعیت ارزش افزایی	آخرین وضعیت	نام پروژه متناظر برای تهاتر	برآورد هزینه مورد نیاز (میلیارد ریال)	مجوز های اخذ شده
۱	اراضی پایاب سد چالیدره	۵۷۲۲۵	۱۴۰۰۰	اراضی پایاب و مخزن سد چالیدره با قابلیت توسعه فعالیت های گردشگری به عنوان آورده قابل مولد سازی مصوب شده است.	کسب مجوز تغییر کاربری اراضی به گردشگری از کمیسیون امور زیربنایی استان	متوقف به دلیل عدم اخذ سند تک برگ	فاز دوم - تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی زون یک	۷۰۰۰	کارگروه مولد سازی استان
							فاز اول - تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی هزار مسجد (اجرای تونل آب بر توسط موسسه فاطر)	۷۰۰۰	
۲	اراضی پایاب سد کارده	۴۹۲۲۰	۹۰	تغییر کاربری به خدمات و یا صنعتی (دامداری ، مرغداری و ...)	در مرحله پیگیری	به دلیل ارزش پایین زمین از اولویت خارج شده است	تصمیم گیری نشده است.		
۳	اراضی پاسباران سرخس	۸۱۰۰۰	۲۵	تغییر کاربری به خدمات و یا صنعتی (دامداری ، مرغداری و ...)	در مرحله پیگیری	به دلیل ارزش پایین زمین از اولویت خارج شده است	تصمیم گیری نشده است.		

اراضی چالیدره



اراضی پاسباران سرخس




اراضی کارده



طرح های هدف مولد سازی

فاز اول - تامین آب مشهد از منابع آب مرزی یال شمالی هزارمسجد

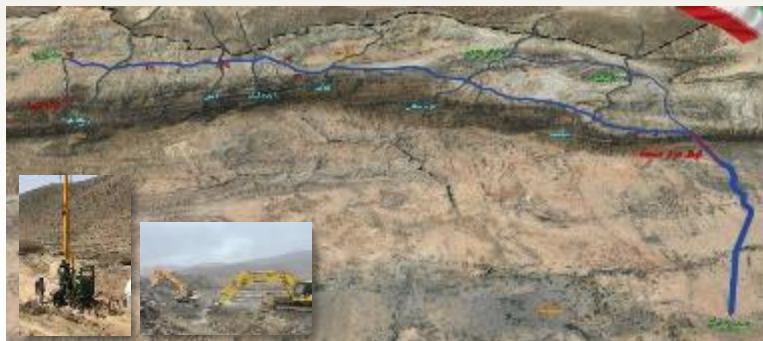

فاز یک در دست اجرا: تونل آب بر به طول ۸.۵ کیلومتر



۱۰ میلیون متر مکعب

۱۵۰ میلیارد تومان


هدف پروژه 

مطالبات تاکنون

۲۵۰۰ میلیارد تومان

مبلغ مورد نیاز پروژه

فاز دوم - تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی زون یک

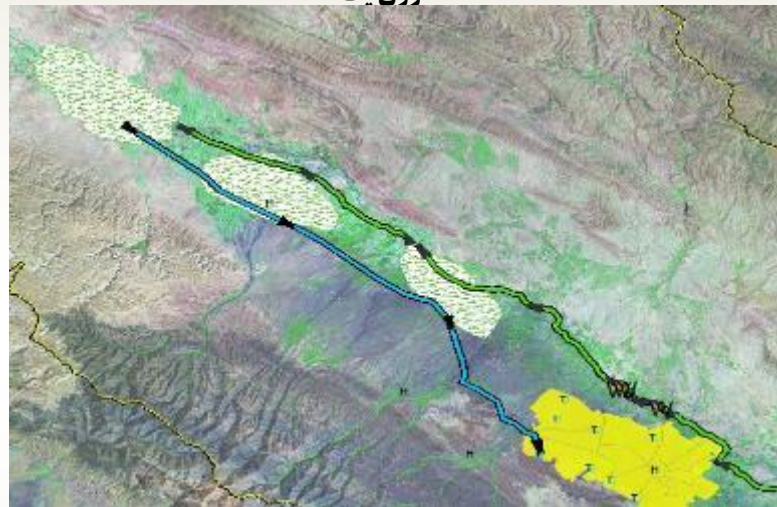

لزوم اخذ مجوز ماده ۲۳ برای افزایش اعتبار مورد نیاز



۳۵ میلیون متر مکعب

۹۷ میلیارد تومان

هدف پروژه 

هزینه شده

۱۵۰۰ میلیارد تومان

مبلغ مورد نیاز تا اتمام پروژه

جلسه تفاهم نامه مولد سازی وزارت نیرو و استانداری



استانداری خراسان رضوی
پست: ...
تاریخ: ۱۴۰۲

با صلوات بر محمد و آل محمد

مضوبه کار گروه استانی مولدسازی دارایی های دولت

دومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت رأس ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در محل استانداری خراسان رضوی تشکیل و به استناد تقویم بخشی از اختیارات مولدسازی دارایی های دولت به استانداران موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۷۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ سازمان خصوصی سازی، در خصوص موارد زیر تصمیم گیری و مشور شد این پیشنهادات به منظور اخذ مضوبه هیات عالی مولدسازی به دبیرخانه هیات ارسال شود:

۴- سازاد بودن تعداد یک فقره از املاک با بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (پیوست ۵) مورد تایید کارگروه قرار گرفت و پیشنهاد شد در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت، با فروش اقساطی املاک یادشده

محمدحسین آقایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

محمدحسین آقایی
نایب رئیس و عضو مرکز خراسان رضوی

سید محمد حسینی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

جواد خدایی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

محمودرضا عظیمی
استادکار خراسان رضوی

سامانه مولد سازی

پورتال حاکمیت شرکتی - مولدسازی دارایی ها

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

حاکمیت

**گزارش در ارتباط با نحوه تسویه و تهاتر
بدهی ها با استفاده از ظرفیت های قانون
بودجه سال ۱۴۰۳**

استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسویه مطالبات

میلیون ریال

ردیف	نام ارگان	مانده ابتدای دوره سال ۱۴۰۳	تسویه شده از طریق اوراق تسویه	قبوض صادر شده طی سال ۱۴۰۳	مانده پایان دوره سال ۱۴۰۳
1	ارتش	۷۴۸۶۷	۷۸۵۸۲	۹۶۳۲۴	۹۲۶۰۹
2	سپاه	۳۵۶۰۳	۳۵۶۰۳	۳۵۰۶۶	۳۵۰۶۵
3	نیروی انتظامی	۱۰۳۲۹	۱۰۱۲۹	۱۰۸۳۵	۱۱۰۳۵
جمع					

The background features several thick, translucent blue wavy lines that flow across the frame, creating a sense of movement. Interspersed among these lines are several small, solid blue squares. Some of these squares are in sharp focus, while others are blurred, suggesting a three-dimensional space. The overall color palette is a range of blues, from light sky blue to deep navy blue, set against a clean white background.

با تشکر از اعضاء محترم مجمع عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
