



وزارت نیرو

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه خراسان رضوی

گزارش عملکرد طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل اول

طرحها و پروژه های تملک دارائیهای
سرمایه ای ، اعتبارات مصوب ، عملکرد
منابع تامین اعتبار


۱-۱- طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش :

مبالغ به میلیون ریال

نام منبع	طرحهای انتفاعی	طرحهای غیر انتفاعی	جمع کل
تعداد طرح	۹	۱۲	۲۱
تعداد پروژه	۱۲	۵۴	۶۶
اعتبار مصوب	۶۷۶۹۰۴۵	۱۷۴۵۵۱۴	۸۵۱۴۵۵۹
تخصیص اعتبار	۴۶۲۶۹۰۹	۸۹۷۵۲۹	۵۵۲۴۴۳۸
عنوان پیمانهای اجرایی	تعداد	مبلغ قراردادهای (مبالغ به میلیون ریال)	
۱) تامین آب از طریق حفر چاه و شبکه جمع آوری و پروژه های مرتبط	۱۵	۱,۹۶۶,۰۲۳۰	
۲) سد سازی و پروژه های مرتبط	۶	۳,۱۲۰,۸۰۰	
۳) خط انتقال و پروژه های مرتبط	۶	۱۳,۶۹۶,۳۹۸	
۴) لایروبی، ساماندهی و تجهیز رودخانه ها و پروژه های مرتبط	۴	۱۸۴,۷۹۷	

اطلاعات مذکور می بایست بر اساس صورت وضعیت مالی حسابرسی شده باشد

۱-۲- مشخصات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای :



۱-۲-۱- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تعداد طرح	تعداد پروژه	درآمد عمومی	صندوق توسعه ملی	اوراق مشارکت تضمین شرکت	اوراق مشارکت تضمین دولت	اسناد خزانه اسلامی	سایر (منابع داخلی، فاینانس داخلی و خارجی ...)	جمع کل
انتفاعی	ملی	۶	۹	۱/۴۶۷/۴۱۵	۲/۴۵۰/۰۰۰		۹۱۹/۴۹۴	۳۰۰/۰۰۰	۴/۸۳۶/۹۰۹
	ملی استانی	۳	۳						
	استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۹	۱۲						
غیر انتفاعی	ملی	۸	۹	۱۴۸/۶۴۹			۲۱۸/۴۵۵		۳۶۷/۱۰۴
	ملی استانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	استانی	۴	۴۵	۸۶۳/۷۲۳	۰	۰	۶۰/۰۰۰	۶۳/۰۰۰	۹۸۶/۷۲۳
	جمع	۱۲	۵۴						
جمع کل	ملی	۱۴	۱۸	۱/۶۱۶/۰۶۴	۲/۴۵۰/۰۰۰		۱/۱۳۷/۹۴۹	۳۰۰/۰۰۰	۵/۵۰۴/۱۳
	ملی استانی	۳	۳						
	استانی	۴	۴۵	۸۶۳/۷۲۳			۶۰/۰۰۰	۶۳/۰۰۰	۹۸۶/۷۲۳
	جمع	۲۱	۶۶	۲/۴۷۹/۷۸۷	۲/۴۵۰/۰۰۰		۱/۱۹۷/۹۴۹	۳۶۳/۰۰۰	۶/۴۹۰/۷۳۶

منابع تامین اعتبار (ملی استانی)

منابع تامین اعتبار (استانی)

منابع تامین اعتبار (ملی)

۱-۲-۲- فصول سرمایه گذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

فصول سرمایه گذاری					تعداد پروژه	تعداد طرح	شرح	
جمع فصول	فصل هفتم	فصل ششم	فصل دوم	فصل اول				
۵/۱۳۶/۹۰۹	۳۳/۱۳۱	۱۱۰/۰۰۰		۴/۹۹۳/۷۷۸	۹	۶	ملی	انتفاعی
					۳	۳	ملی استانی	
.	.	.	.	.	۰	۰	استانی	
					۱۲	۹	جمع	
۳۶۷/۱۰۴	۲۱/۳۷۰			۳۴۵/۷۳۴	۹	۸	ملی	غیر انتفاعی
.	.	.	.	.	۰	۰	ملی استانی	
۹۸۶/۷۲۳	۹/۵۵۰	.	.	۹۷۷/۱۷۳	۴۵	۴	استانی	
					۵۴	۱۲	جمع	
۵/۵۰۴/۰۱۳	۵۴/۵۰۱	۱۱۰/۰۰۰		۵/۳۳۹/۵۱۲	۱۸	۱۴	ملی	جمع کل
					۳	۳	ملی استانی	
۹۸۶/۷۲۳	۹/۵۵۰			۹۷۷/۱۷۳	۴۵	۴	استانی	
۶/۴۹۰/۷۳۶	۶۴/۰۵۱	۱۱۰/۰۰۰		۶/۳۱۶/۶۸۵	۶۶	۲۱	جمع	

فصول سرمایه گذاری (ملی استانی)

فصول سرمایه گذاری (استانی)

فصول سرمایه گذاری (ملی)

۱-۲-۳- عملکرد منابع تامین اعتبار :

مبالغ به میلیون ریال

دریافتی تجمیعی	سال مورد گزارش					شرح
	مصرف نشده	عملکرد	دریافتی	تخصیص اعتبار	اعتبار مصوب	
	۰	۲/۰۰۳/۰۶۸	۲/۰۰۳/۰۶۸	۲/۰۰۳/۰۶۸	۲/۴۷۹/۷۸۷	منابع عمومی دولت
	۰	۲/۴۵۰/۰۰۰	۲/۴۵۰/۰۰۰	۲/۴۵۰/۰۰۰	۲/۴۵۰/۰۰۰	صندوق توسعه ملی
						اوراق مشارکت با تضمین شرکت
						اوراق مشارکت با تضمین دولت
	۰	۱/۱۹۷/۹۴۹	۱/۱۹۷/۹۴۹	۱/۱۹۷/۹۴۹	۱/۱۹۷/۹۴۹	اسناد خزانه اسلامی
	۰	۳۶۳/۰۰۰	۳۶۳/۰۰۰	۳۶۳/۰۰۰	۳۶۳/۰۰۰	سایر (منابع داخلی ، فاینانس داخلی ، فاینانس خارجی و ...)
	۰	۶/۰۱۴/۰۱۷	۶/۰۱۴/۰۱۷	۶/۰۱۴/۰۱۷	۶/۴۹۰/۷۳۶	جمع



۱-۲-۴- وضعیت اعتبارات دریافتی از محل منابع عمومی در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تعداد طرح	تعداد پروژه	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافتی از خزانه	عملکرد		برگشت به خزانه
						قطعی	غیر قطعی	
انتفاعی	ملی	۶	۹	۴,۰۲۷,۵۵۰	۴,۰۲۷,۵۵۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۱,۲۷۱,۰۲۸	.
	ملی استانی	۳	۳	۱,۱۰۹,۳۵۹	۱,۱۰۹,۳۵۹	۸۵۶,۴۲۷	۲۵۲,۹۳۲	.
	استانی	.	.	.	.	.	.	.
	جمع	۹	۱۲					.
غیر انتفاعی	ملی	۸	۹	۳۶۷/۱۰۴	۳۶۷/۱۰۴	۳۶۷/۱۰۴		.
	ملی استانی	.	.	.	.	.	.	.
	استانی	۴	۴۵	۹۸۶/۷۲۳	۵۱۰/۰۰۴	۳۸۳/۰۶۰	۱۲۶/۹۴۴	.
	جمع	۱۲	۵۴					.
جمع کل	ملی	۱۴	۱۸	۵/۵۰۴/۰۱۳	۵/۵۰۴/۰۱۳	۳/۹۸۰/۰۵۳	۱/۵۲۳/۹۶۰	.
	ملی استانی	۳	۳					.
	استانی	۴	۴۵	۹۸۶/۷۲۳	۵۱۰/۰۰۴	۳۸۳/۰۶۰	۱۲۶/۹۴۴	.
	جمع	۲۱	۶۶	۶/۴۹۰/۷۳۶	۶/۰۱۴/۰۱۷	۴/۳۶۳/۱۱۳	۱/۶۵۰/۹۰۴	.

اعتبارات دریافتی (ملی استانی)

اعتبارات دریافتی (استانی)

اعتبارات دریافتی (ملی)

۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۲	تا پایان اذر ماه
۱	تامین آب شرمشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد *	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	۱	۷	--	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۴۰۷	--	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۶۸,۳۴۹	۰	۲,۷۲
۲	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شور یجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۲	۷	--	۱۳۸۸	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۹,۹۲۶,۲۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۷۹۹	۱۴,۸۰	۶۱,۵۵
۳	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	--	۷	--	۱۳۹۱	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۳,۱۳۱,۲۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۱۱	۲,۹۱	۴۱,۳۲
۴	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	--	۷	--	۱۳۸۹	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱,۳۹۳,۲۹۰	۱,۳۹۳,۲۹۰	۸۵۲,۶۰۴	۱۲,۱۳	۴۸,۴۵
۵	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	--	۷	--	۱۳۷۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱,۴۱۷,۷۳۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۴۰	۳,۵۴	۶۵,۴۹

❁ در سال ۱۴۰۲ اعتبار آن در موافقت نامه شهرهای دارای تنش آبی دیده شده ولی بدلیل عدم مجوز کمیسیون ماده ۲۳ فاقد تخصیص و ابلاغ اعتبار می باشد. طبق نامه ابلاغ شماره ۱۴۰۱/۱۰/۱۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ معاونت محترم آب و آبفای وزیر از محل منابع داخلی مبلغ ۳۶۸ میلیارد ریال و از محل بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال شده است.



۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۲	تا پایان اذر ماه
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب														
۶	سامانه آبیگر شناور سد دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	--	۷	--	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	--	۶۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۸۰,۹۳
۷	حفاری چاههای تامین آب مشهد از ابخوان غرب مشهد	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	--	۷	--	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	--	۳,۹۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۶۰,۲	۶۷,۸۱
۸	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	--	۷	--	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۴	--	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۸۶
۹	ابرسانی از سد تبارک به شهر قوچان	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	--	۷	--	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۱۴۰۳	--	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰	۵۹	۹۷
۱۰	تاسیسات پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی آب سد مخزنی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	--	۷	--	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۱۴۰۴	--	۲۹۵,۸۸۵	۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۷,۴۷	۸۴,۳۴



ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۲	تا پایان اذر ماه
۱۱	تامین وانتقال آب در حوزه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	--	--	۷	متمركز	--	متمركز	--	--	متمركز	--	--	ادامه دار
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور														
۱۲	عملیات ساماندهی رودخانه مرحله دو (در محدوده شهری کلات)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	--	--	۷	متمركز	--	متمركز	۱۲۱,۲۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	متمركز	--	۱۸,۸	۶۴,۴
۱۳	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	--	--	۷	متمركز	--	متمركز	--	۱,۵۰۰,۰۰۰	متمركز	۳۳۷,۵۰۰	۲۲,۰۸	۷۵,۶



۱-۲-۵- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۲	تا پایان اذر ماه
طرح های دارای دیون / ساختمان سد و شبکه آبیاری - زهکشی														
۱۴	چهچه	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۷	۲	√	--	۱۳۸۵	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۷۵۹,۳۱۷	۷۹۰,۰۳۵	۷۹۰,۰۳۵	۷۵۹,۳۱۷	--	۱۰۰
۱۵	سررود (قره تیکان)	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۲	۲	√	--	۱۳۸۵	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱,۱۶۸,۵۶۵	۱,۳۸۷,۲۰۱	۱,۱۶۸,۵۶۵	۱,۱۶۸,۵۶۵	--	۱۰۰
۱۶	زنگلانو (آبیورد)	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۰	۲	√	--	۱۳۸۱	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۲,۳۵۴,۹۶۸	۲,۵۳۵,۴۴۱	۲,۳۵۴,۹۶۸	۲,۳۵۴,۹۶۸	۰,۴۱	۹۹,۲۶
۱۷	شبکه آبیاری - زهکشی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	۱	√	--	۱۳۷۵	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱,۷۶۳,۷۶۹	۱,۹۵۹,۷۷۴	۱,۷۶۳,۷۶۹	۱,۷۶۳,۷۶۹	--	۱۰۰



۱-۲-۶- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (استانی):

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (ای)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع دریافتی تاکنون	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۲	تا پایان آذر ماه
اجرای ساماندهی رودخانه ها													
۱۸	اجرای ساماندهی رودخانه کشف رود	۱۳۰۷۰۰خ۲۰۵	--	--	۷	۱۳۹۰	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۳۵۶,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۶۷	۲۲,۰۸	۷۵,۶
۱۹	لایروبی و ساماندهی رودخانه کلات	۱۳۰۷۰۰۵خ۲۰۵	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۲۱,۲۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۸	۲۵,۹۷	۶۴,۴
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب													
۲۰	تامین آب شرب مشهد از کارده (پیش تصفیه کارده و کاهش بارچلپکی)	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۲۹۵,۸۸۵	۲۹۵,۸۸۵	۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۴۷	۸۴,۳۴
۲۱	عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه کپکان -گرنی	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	.	.	۰,۸۱
۲۲	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	۱,۴
۲۳	کانال انتقال آب جمعباب شهرستان چناران	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۸۰,۲۰۰	۱۸۰,۲۰۰	.	.	۴,۳۸
۲۴	بهره برداری و مرمت شبکه های آبیاری - زهکشی پایاب سدهای مخزنی چهچه و سررود	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۷۴,۹۳۷	۱۷۴,۹۳۷	۱۰۴,۹۳۷	۸۹,۷	۹۹,۶۱
۲۵	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبگیر کشاورزی سرخس	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۲۲۳,۸۴۲	۲۲۳,۸۴۲	۱۳,۸۴۲	.	۱۲,۱۵
۲۶	استفاده بهینه از رواناب رودخانه شور رود	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۵۷۳,۴۰۷	۷۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۰۷	.	۳۱,۲۵
۲۷	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل - دولت اباد	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	--	--	۷	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.	۴۰,۲۷

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		بر آورد هزینه (موافقت نامه ای)	بر آورد هزینه واقعی)	جمع دریافتی تاکنون	درصدپیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی				در سال ۱۴۰۲	تا پایان آذر ماه
طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی / پروژه : تغذیه سفره های اب زیر زمینی													
۲۸	تغذیه مصنوعی چاههای شرب گیسور	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	--	--	۷	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۴۱،۶۱۶	۴۱،۶۱۶	۲۴،۵۲۵	۰	۱۰۰
۲۹	ساماندهی تغذیه مصنوعی فاروب رومان	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۱۴۰۷	۶۰،۹۳۶	۵۰۰،۰۰۰	۲۷،۲۹۶	۳۲،۵۰	۹۰
۳۰	تغذیه مصنوعی شانديز	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	--	--	۷	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۵۸،۲۷۲	۶۵۰،۰۰۰	۱۸،۱۹۲	۳۸	۸۶،۶
طرح تامین زیر ساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی													
۳۱	تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی مشهد شماره (۵)	۱۳۰۴۰۱۲خ۱۰۲	-	--	۷	۱۳۹۶	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۲۳۱،۲۹۵	۵۳۱،۲۹۵	۳۶،۲۹۵	۰	۱۹،۵



۱-۲-۷- سیمای کلی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (ملی ، استانی) :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	تعداد پروژه	نوع طرح		سال شروع	سال خاتمه		برآورد هزینه (موافقت نامه)	برآورد هزینه (واقعی)	جمع هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی	
				انتفاعی	غیر انتفاعی		طبق قانون	پیش بینی					در سال ۱۴۰۲	تا پایان اذر ماه
۱	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	--	√	--	۱۳۹۱	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۳,۱۳۱,۲۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۱۱	۱,۲۷۷,۰۱۱	۲,۹۱	۴۱,۱
۲	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	--	√	--	۱۳۸۹	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱,۳۹۳,۲۹۰	۱,۳۹۳,۲۹۰	۸۵۲,۶۰۴	۸۵۲,۶۰۴	۱۲,۱۳	۴۸,۴۵
۳	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	--	√	--	۱۳۷۶	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱,۴۱۷,۷۳۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۴۰	۱,۲۱۹,۶۴۰	۳,۵۴	۶۵,۴۹

۱-۳- وضعیت اعتبارات پژوهشی تفویض اختیار شده از محل طرح تحقیقات کاربردی از طرف مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران : نداریم

(پیرو ابلاغیه نظام نامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه ای برای سال مالی ۱۳۹۴)

شرح	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
اعتبار تخصیصی در سال مورد گزارش		
تعداد پروژه های پژوهشی عقد قرارداد شده		
جمع مبالغ پروژه های عقد قرارداد شده		
تعداد پروژه های پژوهشی تحت نظارت		
جمع مبالغ پروژه های پژوهشی تحت نظارت		
هزینه کرد اعتبارات تخصیصی		
نسبت اعتبارات هزینه شده به تخصیص داده شده :		
مشکلات و موانع موجود :		
پیشنهادهات :		

۱-۴- وضعیت نقل و انتقال طرحها و پروژه هایی که در سال مالی ۱۴۰۲ خاتمه یافته و به عملیات جاری منتقل گردیده است :

شماره طرح	نام طرح	نام پروژه	مبلغ (میلیون ریال)
۱۰۲ خ ۱۳۰۴۰۱۲	تامین زیرساخت های شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی	تامین آب شهرک صنعتی کاویان از سد دوستی-قطعه اول	۳,۳۲۵
		تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی مشهد	۲,۴۱۳
۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی	شبکه آبیاری و زهکشی سد دوستی	۱,۰۰۹,۴۱۷
۱۳۰۷۰۰۳۲۳۰	ساختمان سد زنگلانلو و شبکه آبیاری و زهکشی	ساختمان سد ابیورد * زنگلانلو	۶۲۳,۳۴۳
		شبکه آبیاری و زهکشی سد ابیورد * زنگلانلو	۱۱,۱۳۶
۱۳۰۷۰۰۳۲۳۲	ساختمان سد قره تیکان و شبکه آبیاری و زهکشی	ساختمان سد قره تیکان	۶۷,۶۰۱
۱۳۰۷۰۰۳۲۳۷	ساختمان سد چهچه و شبکه آبیاری و زهکشی	ساختمان سد چهچه	۶۹

۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است :

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دوستی - شهرستان سرخس	سرخس	تامین قسمتی از آب شرب شهر مشهد و سرخسبه ترتیب بهمیزان ۱۵۰ و ۵ میلیون متر مکعبدر سال. ب-تامین نیاز صنعت شهر مشهد و نیاز صنعت و ایخوان سر خسبه ترتیب ۱۵ و ۵۷۶ میلیون متر مکعب در سال ب-تامین بخشی از آب مورد نیاز جهت کشاورزی اراضی دشت سرخس به میزان ۱۱۴ میلیون متر مکعب برای ۳۱۹۰۰ هکتار در طرف ایران. ج -مهار سیلاب و جلوگیری از خسارات سیل و فرسایش رودخانه .
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر قوچان از سد تبارک آباد	قوچان	رهاسازی ۲۳۸ لیتر برثانیهاب به کانال هواده بطول ۴۸۰متر و خط انتقال آب با لوله فولادی و فایبرگلاس به قطر ۵۰۰ میلیمتر به ترتیب بطول ۸۰۴ و ۱۴۰۴ کیلومتر با۳۸ باب ابنیه
۳	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	تغذیه مصنوعی چاههای شرب گیسور گناباد	گیسور	به منظور تغذیه سفره اب زیرزمینی و تثبیت ابدی چاههای تامین اب (شرب و بهداشت) شهر گناباد
۴	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	ساماندهی رودخانه کلات در محدوده شهری (مرحله ۱)	کلات	با توجه به شرایط خاص هیدرولوژیکی، توپوگرافیک و هیدرولیک حوضه های آبریز بالادست رودخانه های سطح شهرستان همواره شاهدوقوع سیلاب با دوره بازگشت بالا (۳۶۰-۲۶۰ متر مکعب برثانیه) و بروز خسارات مالی و گاه جانی بوده ایم. در همین راستا، طرح بازگشایی و ساماندهی رودخانه مطالعه و اجرا گردیده است
۵	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۶	احداث بزرگراه مشهد - سنگ بست-فریمان-تربت جام (جابجائی خط انتقال آب (شرب و بهداشت) پادگان ارتش جمهوری اسلامی)	مشهد	به منظور احداث قطعه سوم باند دوم محور مشهد - فریمان و تداخل با خط انتقال آب (شرب و بهداشت) پادگانانمن الاثمه ارتش ولزوم جابجایی خط انتقال اب جهت تسریع در روند عملیات اجرایی احداث باند دوم محور مشهد-فریمان
۶	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چهچهه	کلات	۱- مهار، کنترل، ذخیره و نظیم جریانات دائم و فصلی رودخانه چهچهه ۲- تأمین نیاز آبی ۷۲۹ هکتار از اراضی زراعی و باغی پایاب ۳- ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی منطقه
۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۱۷ - ۹۸۰۴۶۰ ۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه های مرزی خراسان رضوی - اجرای ساماندهی رودخانه های محلی در خارج از محدوده شهرها - لایروبی، ساماندهی رودخانه زنگلانلو، حاتم قلعه و کهنه قلعه شهرستان درگز	درگز	به منظور ایمن سازی و عبور مطمئن رواناب های فصلی ناشی از سیلاب حوضه آبریز رودخانه در محدوده سکونتگاههایی روستای زنگلانلو
۸	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵ - ۹۶۲۸۵۳	اجرای ساماندهی رودخانه های در خارج از محدوده شهرها / عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه حمام قلعه در محدوده روستای ژرف شهرستان کلات	کلات	عبور ایمن سیلاب های احتمالی اتی

۱-۶- طرحهایی که نسبت به برنامه زمانبندی با تاخیر مواجه می باشد :

ردیف	نام طرح	علل تاخیر
۱	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۲	سد مخزنی شورجه و تأسیسات وابسته	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۳	آبرسانی به شهر سرخس	(بعلت عدم تخصیص مناسب و مشکلات اجتماعی و معارضین)
۴	تأمین آب مشهد از سدکارده (پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی)	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۵	آبرسانی به شهر نیشابور و فیروزه از سد بار	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۶	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی ایبورد	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۷	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۸	بهسازی، ترمیم و افزایش کارایی (راندمان) تغذیه مصنوعی شاندیز	تحويل موقت
۹	سامانه آبیگر شناور سد مخزنی دوستی شهرستان سرخس	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح
۱۰	ساماندهی سازه های تغذیه مصنوعی فاروب رومان شهرستان نیشابور	تحويل موقت
۱۱	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان غرب - حفر، تجهیز و اجرای شبکه جمع آوری ۲۵ حلقه چاه	لزوم تخصیص کامل اعتبارات مصوب جهت پرداخت مطالبات قطعی ارکان طرح و مشکلات اجتماعی
۱۲	طرح اضطراری تامین آب (شرب و بهداشت) از چاههای مجتمع عباس آباد و تنگل شور واقع در شرق مشهد	عدم تخصیص اعتبار لازم جهت عملیات اجرایی طرح و مشکلات اجتماعی
۱۳	ایجاد طرحهای کوچک تامین و انتقال آب-احداث و اصلاح کانال انتقال آب اراضی پایاپ سدهای چهچه و قره تیکان	لزوم تخصیص کامل اعتبارات مصوب جهت پرداخت مطالبات قطعی ارکان طرح

۱-۷- طرحها و پروژه هایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی ۱۴۰۲ مورد اجراء قرار گرفته اند :

شماره طرح	نام طرح	تاریخ شروع اجرای طرح	نام پروژه	تاریخ شروع اجرای پروژه
۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	طرح ایجاد طرح های کوچک تامین وانتقال آب	۱۳۷۹	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل - دولت آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰ (بند (م) ماده (۲۸) بحران	طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب	--	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱-۸- طرحها و پروژه هایی که اجرای آنها متوقف شده یا ردیف اجرایی آن حذف شده است :

شماره طرح	نام طرح	نام پروژه	تاریخ توقف / حذف	علل توقف / حذف
۱۰۲ خ ۱۳۰۴۰۱۲	تامین زیر ساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (آب)	شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد	۱۳۹۷	حذف ردیف اعتباری توسط سازمان برنامه بودجه کشور

۱-۹- عملکرد پروژه‌های مرتبط با طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان‌ها

۱-۹-۱- جدول عملکرد برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و مدیریت توأمان آب و برق

پروژه	خلاصه اقدامات انجام شده	ملاحظات	سال گزارش		
			واحد	هدف	عملکرد
برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی	اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی	کل چاه‌های مشمول تعدیل	۴۱۰۰	۴۱۷۶	۱۰۲
	نصب کنتور و ابزار سنجش میزان برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی	دستگاه / چاه	۳۰۰	۲۰۵	۶۸
	پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حلقه	۱۰۰۰	۱۴۳۳	۱۴۳
	حجم صرف‌جویی شده ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز	میلیون مترمکعب بدون لحاظ شدن حجم اصلاح و تعدیل	۳۰	۲۰۰	۵۶۷
مدیریت توأمان آب و برق	پیاده‌سازی فرایند مدیریت توأمان آب و برق برای مدیریت چاه‌های کشاورزی	حلقه چاه کشاورزی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۹-۲- جدول عملکرد پروژه کنتورهای هوشمند حجمی در سال مورد گزارش :

تعداد چاه‌های کشاورزی (حلقه)	تعداد قراردادهای منعقد شده فروش کنتور (عدد)	تعداد کنتور منصوبه (دستگاه)	تعداد کنتورهای نصب نشده به دلیل		تعداد کنتور سالم قرائت شده بعد از نصب	اقدامات نگهداری و پشتیبانی از کل کنتورهای منصوبه
برقی	دیزلی		عدم همکاری بهره‌بردار	عدم ارائه کنتور توسط کنتورساز		
۸۸۶۲	۱۱۰۳					

* با توجه به اینکه ۹۶ درصد چاه‌های برقی واجد شرایط کشاورزی در طی سنوات قبل تا کنون توسط بهره‌برداران کنتور خریداری و نصب شده است، لذا در سال ۱۴۰۲ نیز در ادامه کار تعداد ۹۶ کنتور توسط بهره‌برداران خریداری و نصب گردیده است.

۱-۹-۳- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش :

ردیف	نام مشاور	تعداد گروه	تجهیزات بر اساس شرح خدمات		شروع قرارداد	خاتمه قرارداد	حوزه عمل		مبلغ قرارداد (میلیون ریال)
			کامل	نقص			آب زیرزمینی	آب سطحی	
	مهاب ثامن-نقش آوران توس	۷۰	*		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	۳۸۰۰۰۰

تعداد کل گروه ها	تعداد کارشناس صحرائی (بازدید کننده)	کل بازدیدهای ثبت شده در سام گشت	تعداد چاه مجاز بازدید شده	تعداد چاه غیرمجاز شناسایی شده	تعداد سایر منابع (قنات، آبهای سطحی و...) بازدید شده	سهم چاه های بازدید شده از برنامه اقدام استان
۷۰	۷۰	۴۷۶	۱۳۹۰۱	۱۲۲۶	-	۱۰۰

۱-۱۰- جدول عملکرد تشکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش

ایجاد تشکل	در دست مطالعه								تعداد منبع آبی						نام دشت	نام و کد محدوده مطالعاتی	ردیف
	نام تشکل				وسعت دشت	پیشرفت ریالی	پیشرفت فیزیکی	نام مشاور	کانال	سد	رودخانه	قنات	چشمه	چاه			
	تعاونی تولیدی	شرکتهای سهامی زراعی	تعاونی آب بران	صنفی													
۱			•											۶۸	جنگل	۴۷۲۶	
۱			•											۳۱۸	قوچان	۱۷۰۸	
۱			•											۳۰۰	رشتخوار	۴۷۲۷	

تا آخر دیماه سال جاری تعداد ۳۴ تشکل ایجاد گردیده است.

۱-۱۱- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب (داناب) :

قرارداد	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	مبلغ قرارداد (ریال)	هزینه کرد (ریال)	تعداد دانش آموز مورد هدف	پیشرفت فیزیکی	مدت قرارداد
خدمات مشاوره، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی	آرین پژوهان زیست پایا	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰ درصد از قرارداد خدمات مشاوره پروژه اطلاع رسانی مبلغ کل قرارداد: (ریال ۴,۲۷۰,۳۹۶,۰۰۰)	مشاور+ تفاهم نامه آموزش و پرورش + هزینه های اجرایی و چاپ اقلام جمعا حدود ۵ میلیارد ریال	۳۲۰,۰۰۰ نفر آموزش دانش آموزان متوسطه اول استان خراسان رضوی	۱۰۰	۱۲ ماه

۱-۱۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء در کشور

(هدف: ۱۴/۵ میلیارد متر مکعب کاهش برداشت)

۱-۱۲-۱- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک استان در سال مورد گزارش:

(هدف: ۱۱۹/۳۶ میلیون متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی (MCM)	۲۵/۹	۹۳,۴۶	۰	۱۱۹/۳۶
احیاء و تعادل بخشی (MCM)	۲۸/۱۱	۷۲/۶۳	۰	۱۰۰/۷۴
اقدامات (تعداد)	۳۳,۵۲	۱۷۷,۶	۰	۲۱۱,۱۲
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۲۳۱۲	۰	۳۸۹۲
	احیاء و تعادل بخشی	%۱۲۹	۰	%۱۷۶



۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه آبریز کویر مرکزی در سال

مورد گزارش :

(هدف: ۶۶/۴۷ میلیون متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی (MCM)	۳,۴	۶۳,۰۷	۰	۶۶,۴۷
احیاء و تعادل بخشی (MCM)	۶,۷۲	۷۹,۸	۰	۸۵,۷۲
اقدامات (تعداد)	۵۷۵	۱۲۳۲	۰	۱۸۰۷
سازگاری با کم‌آبی	٪۱۹۷	٪۱۲۶	۰	٪۱۲۸
احیاء و تعادل بخشی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۰	٪۱۰۰
سهم تحقق اهداف				

۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه آبریز اترک در سال مورد گزارش :

(هدف: ۱/۸۵ میلیون متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی (MCM)	۱,۶	۰,۲۵	۰	۱,۸۵
احیاء و تعادل بخشی (MCM)	۰,۴۱	۱,۳	۰	۱,۷۱
اقدامات (تعداد)	۴۳	۴۲	۰	۸۵
سازگاری با کم‌آبی	٪۲۶	٪۵۲۰	۰	٪۹۳
احیاء و تعادل بخشی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۰	٪۱۰۰
سهم تحقق اهداف				

۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه آبریز قره قوم در سال مورد گزارش

:

(هدف: ۳۹/۱۲ میلیون متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم آبی (MCM)	۱۷,۳	۲۱,۸۲	۰	۳۹,۱۲
احیاء و تعادل بخشی (MCM)	۲۶,۳۲	۸۹,۶	۰	۱۱۵,۹۲
اقدامات (تعداد)	۹۴۵	۹۵۲	۰	۱۸۹۷
سازگاری با کم آبی	%۱۵۲	%۴۱۰	۰	%۲۹۶
احیاء و تعادل بخشی	%۱۰۰	%۱۰۰	۰	%۱۰۰
سهم تحقق اهداف				

۱-۱۲-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه آبریز نمکزار خواف در سال مورد گزارش :

(هدف: ۸/۵۲ میلیون متر مکعب کاهش برداشت)

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه جویی
سازگاری با کم‌آبی (MCM)	۰,۲	۸,۳۲	۰	۸,۵۲
احیاء و تعادل بخشی (MCM)	۰,۰۶۵	۶,۹	۰	۶,۹۶
اقدامات (تعداد)	۱۷	۸۶	۰	۱۰۳
سازگاری با کم‌آبی	٪۳۳	٪۸۳	۰	٪۸۲
احیاء و تعادل بخشی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۰	٪۱۰۰
سهم تحقق اهداف				

۱-۱۳- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب :

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	تعداد	تغذیه مصنوعی
۱۱	۴۲,۳۳	۱۳	۴۲,۳۳	۲۲	۴۲,۳۳	۲۰,۲	۴۲,۳۳	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۱۴۹۱	۱۰۰۰	۲۹۲۵	۱۵۰۰	۱۸۰۲	۱۰۰۰	۲۰۶۲	۱۰۰۰	تعداد*	تعادل بخشی
۲۰۰	۳۰	۱۷۵	۵۰	۳۲	۳۰	۵۰,۹	۵۰	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۲۲	۱۴	۳۶	۱۴	۲۴	۲۴	۴۱	۴۱	تعداد	ایستگاه های سنجش
۷۲۵ سراسری ۱۹۲۲ موردی	۸۳۱ سراسری ۱۳۳۵ موردی	۲۴۸۱	۵۰۰	۳۳۰	۶۵۱	۴۰۱	۸۵۰	کیلومتر	تعیین حریم و بستر رودخانه ها
۱۸۶,۵	۱۰۰,۴	۱۸۶	۱۵۰	۱۳	۴,۳۶	۷,۵	۱۶,۱	کیلومتر	ساماندهی و لایروبی رودخانه ها
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه	کمکهای فنی و اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	بهبود (هکتار)	

ادامه ۱-۱۳- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب :

در دو ردیف اول جدول باید حوزه مطالعات نیز طرح های خودشان را اضافه کنند.

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
۲	۲	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	تعداد/ نقطه محل	مطالعه/ نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری
۲	۲	۱	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	تعداد/ نقطه محل	پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری
۱	۵	۴	۸	۱۳	۱۵	۷	۱۰	پروژه	طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)
۰	۱۰	۵	۱۴	۱۹	۲۱	۱۴	۲۰	پروژه واحد این دو ردیف تعداد پروژه است. همکاران حوزه حفاظت دقت نمایند.	طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)

۱-۱۴- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل :

عنوان برنامه	هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه‌ها (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	۹	۴	۹۰۶۲۲
	ملی (مرزی)	-	-	-
	استانی (غیر مرزی) پسته ملکش	۲	۵	۱۰۰۰۰
عملیات اجرایی لایروبی رودخانه‌ها	ملی	۱۱	۵	۱۵۰۹۴
	استانی	۸۷	۱۷۲	۵۰۰۰۰
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها	ملی	۸۳۵	۷۲۵	۸۵۵۲۰
	استانی	-	-	-
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌ها	ملی	۵۵,۲۵	۱۷	۵۱۶۴
	استانی	----	----	-
اجرای حد بستر و حریم رودخانه‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۲۲۸,۷۵	۲۰	۱۹۱۹۰
	استانی	-	-	-
مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریاچه و تالاب‌ها	ملی	عدم مصداق		
	استانی			
اجرای حد بستر و حریم دریاچه و تالاب‌ها (نشانه گذاری)	ملی	عدم مصداق		
	استانی			

ادامه ۱-۱۴- عملکرد برنامه طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و طرح مرمت و بازسازی

تاسیسات آبی در دست بهره برداری : اسم طرح سد و شبکه ای که عملکرد داشته در زیر جدول

توضیح دهید

عنوان برنامه	هدف (پروژه/نقطه محل)	عملکرد (پروژه/نقطه محل)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
مطالعه/نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۰	۰	۰	۰
پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۲	۲	۵۰۰۰	۱۰۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)	۳	۲	۱۲۰۰۰	۶۷
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)	۵	۳	۲۰۰۰	۶۷

در سدهای طرق (دو پروژه) و زاوین و شبکه های آبیاری یعقوبی و مدرس عملیات طرح مرمت و بازسازی صورت گرفته است

۱-۱۵- وضعیت نیروگاه برقابی: نداریم

وضعیت مطالعه نیروگاه های برق آبی استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	فاز مطالعاتی	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالیانه (گیگاوات ساعت)	توضیحات

وضعیت نیروگاه های برق آبی در حال ساخت استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالیانه (گیگاوات ساعت)	سال ورود به مدار	توضیحات

۱-۱۷- مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها (متمرکز) :

اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح									
ردیف	نام طرح	کد طرح	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار مصوب کل سال	پرداختی تا کنون	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)	
								تا پایان سال قبل متوسط	در سال جاری
									واقعی (تجمعی)
	ساماندهی رودخانه های مرزی	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	۱۳۷۳	ادامه دار	۷۵۰۰	۲۱۰۸۴۶	۷۵۰۰		متمرکز
	ساماندهی تعیین حریم و بستر رودخانه در حوضه های آبریز	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱۳۷۳	ادامه دار	۵۶۶۰۲۶	۲۱۹۲۰۰	۲۱۹۲۰۰		متمرکز

۱-۱۸- گزارش وضعیت دارائیهها و اموال مازاد و بلا استفاده (ارقام به میلیون ریال): نداریم

وضعیت فیزیکی اموال

نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات

فصل دوم

ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه
ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها

۲-۱- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها :

اولویت	کد طرح	عنوان طرح / پروژه	اهداف کمی طرح							درصد تحقق اهداف شهریور ماه ۱۴۰۳ (پیشرفت فیزیکی واقعی)
			کشاورزی	شرب	صنعت	کنترل سیل	زیست محیطی	گذر برق آبی	سایر	
۱	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد		✓						۱,۸۵
۲	۱۳۰۷۰۰۷۰۴۵	سد مخزنی شور یجه و تأسیسات وابسته	✓	✓						۵۳,۱۷
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	آبرسانی از سد بار به شهر نیشابور		✓						۴۰,۳۴
۴	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	آبرسانی به شهر سرخس		✓						۴۸,۴۵
۵	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی		✓	✓					۶۵,۴۹
آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب										
۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	سامانه آبیگر شناور سد دوستی		✓						۸۰,۹۳
۷	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان غرب - حفر، تجهیز و اجرای شبکه جمع آوری ۲۵ حلقه چاه		✓						۵۶,۷۴
۸	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	طرح اضطراری تامین آب (شرب و بهداشت) از چاههای مجتمع عباس آباد و تنگل شور واقع در شرق مشهد		✓						۷۴,۳۳
۹	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه		✓						۱۵,۱۴
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	تاسیسات پیش تصفیه کاهش بار جلبکی سد مخزنی کارده		✓						۷۹,۹۶
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی از سد تبارک به شهر قوچان		✓						۹۷

۲-۱- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها :

اولویت	کد طرح	عنوان طرح / پروژه	اهداف کمی طرح					درصد تحقق اهداف شهریور ماه ۱۴۰۳ (پیشرفت فیزیکی واقعی)	
			کشاورزی	شرب	صنعت	کنترل سیل	زیست محیطی		گذر برق آبی
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور									
۱۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	لایروبی و ساماندهی رودخانه زنگلانلو، حاتم قلعه و کهنه قلعه				۷			۱۰۰
۱۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه حمام قلعه در محدوده روستای ژرف				۷			۱۰۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود				۷			۷۴,۰۶
طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها									
۱۵	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک				۷			۷۴,۰۶
۱۶	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	ساماندهی سازه های تغذیه مصنوعی فاروب رومان شهرستان نیشابور	۷			۷			۹۰
۱۷	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	لایروبی و ساماندهی رودخانه کلات (مرحله دو)				۷			۲۵,۹۷
طرح اجرای حفاظت و احیاء اب های زیر زمینی / پروژه : تغذیه سفره های اب زیر زمینی									
۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	تغذیه مصنوعی چاههای گیسور گناباد							۱۰۰
۱۹	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	ساماندهی و تغذیه مصنوعی فاروب رومان							۹۰
۲۰	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶	تغذیه مصنوعی شاندیز							۸۶,۶

۲-۱- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها :

اولویت	کد طرح	عنوان طرح /پروژه	اهداف کمی طرح							درصد تحقق اهداف شهریور ماه ۱۴۰۳ (پیشرفت فیزیکی واقعی)
			کشاورزی	شرب	صنعت	کنترل سیل	زیست محیطی	گذر برق آبی	سایر	
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب										
۲۱	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	بهره برداری و مرمت شبکه های آبیاری و زهکشی پایاپ سدهای چهچهه و قره تیکان	۷							۹۹,۶۱
۲۲	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل – دولت اباد شهرستان گلپهار	۷							۱۴,۴۴
۲۳	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	تأمین آب مشهدازسدکارده (پیش تصفیه و کاهش بارجلبکی)		۷						۷۹,۹۶
۲۴	۱۳۰۷۰۰۰خ۲۵۵	استفاده بهینه از منابع آب رودخانه شور رود شهرستان میان جلگه	۷	۷						۲۲,۳۱
۲۵	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	عملیات اجرایی احداث دهانه های آبگیر رودخانه کپکان – گرنی شهرستان درگز	۷							۰
۲۶	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۷							۰
۲۷	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	کانال انتقال آب جمعاب شهرستان چناران	۷							۰
۲۸	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبگیرکشاورزی	۷							۰

فصل سوم

مقایسه گزارش حسابرسی مستقل

۳-۱- مقایسه گزارش حسابرس مستقل سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل :

تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش		تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل	
سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل
----	----	۱	۳

فصل چهارم

وضعیت نیروی انسانی شاغل

۴-۱- نیروی انسانی شاغل :

افزایش (کاهش)	انتهای سال مالی ۱۴۰۲					ابتدای سال مالی ۱۴۰۲					عنوان
	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۱	۳۴	۳۳	۱	۰	۰	۳۵	۳۳	۲	۰	۰	کارمندان طرح
۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	کارگران طرح
۱	۳۵	۳۳	۱	۰	۱	۳۶	۳۳	۲	۰	۱	جمع

فصل پنجم

فن آوری اطلاعات و

امنیت سایبری زیر ساخت ها

۵-۱- عملکرد اعتبارات بند ز تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲- امن سازی زیر ساخت ها :

میزان کل اعتبار: ۸۰۷۰۰ مبالغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	جداسازی اینترنت از اینترنت	خرید RBI و سرور	۸۰٪	مجوز و ابلاغ کلی از افتا اخذ شده است	۲۸۰۰
۲	قرارداد ISMS	امن سازی و مقاوم سازی در محدوده اتاق سرور در قرارداد پیش بینی و اجرا شده است	۶۰٪	کمیته امنیت سایبری- شرکت رتبه ۱ افتا در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات	۱۴۰۰۰
۳	تهیه سرور جداسازی اینترنت از اینترنت	خرید و استقرار سرور	۱۰۰٪	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و کمیته امنیت سایبری	۸۰۰۰
۴	جداسازی شبکه صنعتی	خرید سرور و سوئیچ	۱۰۰٪	کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و کمیته امنیت سایبری	۵۵،۹۰۰

۵-۲- عملکرد اعتبارات بند سی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۲ - پدافند سایبری : میزان کل اعتبار:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	اجرای پروژه میرورینگ سامانه مجازی سازی و ذخیره سازی در سایت پشتیبان شامل فاز دوم تجهیزات سن استوریج، ریکاورپوینت و خدمات فنی	تامین اعتبار به میزان ۲۷۰۰۰ میلیون ریال از محل طرح انجام شده است. اما به دلیل تخصیص اعتبار از محل اسناد خزانه ۱۴۰۵، تا کنون هیچ شرکتی حاضر به همکاری نشده است	-	مصوبه کمیته امنیت سایبری دارد	-

۵-۳- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوزها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	جداسازی شبکه صنعتی از شبکه داخلی	فاز دوم (خرید تجهیزات: سوئیچ شبکه) فاز اول از محل اعتبارات مصوبه شورای عالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ طرح انجام شده است	٪۱۰۰	طی جلسه مشترک با مرکز افتا خراسان رضوی و صورتجلسه مشترک	۲۹۰۰
۲	تهیه و پیاده سازی طرح تداوم کسب و کار (BCP) و طرح بازگشت پذیری از حادثه (DRP) (در قالب قرارداد ISMS)	سند کلی و روش اجرایی تهیه شده است. طرح های تفکیکی برای سرویس ها، سامانه ها و فرآیندها با اولویت سامانه ها و سرویس های حیاتی در حال انجام است	٪۷۰	کمیته امنیت سایبری	در قالب قرارداد ISMS
۳	برگزاری دوره های آموزشی	دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و فرهنگ سازی امنیت	٪۱۰۰	کمیته امنیت سایبری	در قالب قرارداد ISMS
۴	ایجاد مرکز داده پشتیبان	در محل امور منابع آب مشهد ایجاد شده تجهیزات مرتبط با پشتیبان گیری اطلاعات شامل نس استوریج و فاز اول تجهیزات مجازی سازی سن استوریج برای این سایت خریداری شده است- از محل اعتبارات مصوبه شورای عالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱	٪۵۰	کمیته امنیت سایبری - کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ارائه عملکرد در خصوص نامه ۱۴ بندی وزیر محترم نیرو بوده است. اما عملکرد هزینه ای مربوط به سنوات پیش از ۱۴۰۲ می باشد.
۵	راه اندازی مرکز SOC	اعتبار مورد نظر پیش بینی شده اما به دلیل تعدد پروژه های اجرایی به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ منتقل گردید و در حال پیگیری است	تهیه شرح خدمات	مصوبه کمیته امنیت سایبری	

فصل ششم

عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد



۶-۱- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد (خارج از شمول) در سال مالی ۱۴۰۲ :

براساس نامه شماره ۵۴۰۰/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	طبقه بندی فصول هزینه				جمع مبلغ
			فصل اول مطالعه و اجراء	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل ششم زمین	فصل هفتم سایر دارائیهای تولید نشده و حق الزحمه کارکنان	
۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵		۱۰,۰۰۰	-----	-----	-----	۱۰,۰۰۰
۲	۱۳۰۷۰۰۶۶۶۶		۳,۰۰۰	-----	-----	-----	۳,۰۰۰
		جمع	۱۳۰۰۰				

فصل هفتم

معاملات شرکت



۷-۱- معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات مناقصه و مناقصه عمومی و محدود طی سال مالی ۱۴۰۲:

مبالغ به میلیون ریال

نحوه عقد قرارداد	تعداد	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
مناقصه عمومی	۲۱	۲۵٪	۲۰,۴۹۹,۶۳۶	
ترک تشریفات	۲۳	۲۸٪	۲,۵۳۱,۱۳۶	
مناقصه محدود	----	----	----	
استعلام	۱۰	۱۲٪	۵۷,۸۳۷	
سایر	۲۹	۳۵٪	۶۰۱,۹۳۰	
جمع کل	۸۳	۱۰۰	۲۳,۶۹۰,۵۳۹	

۷-۲- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۶۲۰,۶۱۳	٪۱۴۶۲
	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۳۸,۱۴۵	۱	۲۱,۴۷۱	٪۵۶
	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۱۸,۵۰۰	۱	۱۲۵,۹۷۷	٪۳۰
	ابرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۳۹۸,۷۵۰	۱	۱۲,۴۰۰	٪۳
	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵خ۲۰۵	۱۱۷,۶۵۱	۲	۳۷,۳۴۹	٪۳۲
	اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی سطح استان	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	۱۷۰,۰۶۸	۱	۵,۸۲۱	٪۳
	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوریجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۳,۳۷۵,۵۰۰	۳	۲,۶۲۳,۴۴۳	٪۷۸
	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳خ۲۵۵	۵۹۹,۰۰۴	۱	۲۰۵,۱۸۸	٪۱۳
	ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع:				۲۱		

۷-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود: (ارقام به میلیون ریال): **نداریم**

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
جمع:						

۷-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	ابرسی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳,۰۱۷	۰,۳٪
	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۱۸,۵۰۰	۲	۲۱,۳۴۰	۵,۱٪
	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۳۸,۱۴۵	۱	۹,۹۰۰	۲۶,۰٪
	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱۰۴,۴۰۰	۲	۷,۹۱۶	۷,۶٪
	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۱۴,۰۰۰	۳	۱۵,۶۶۴	۱۱۱,۹٪
جمع:				۱۰		

۷-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از ترک تشریفات: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	آبرسانی به شهرهای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰		۱۹	۲,۰۵۶,۵۴۸	٪۰,۳
	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸		۲	۱۷۶,۷۶۲	٪۵,۱
	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴		۱	۲۰۵,۷۹۰	٪۲۶,۰
	ایجاد طرحهای کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳۲۵۵		۱	۹۲,۰۳۶	٪۷,۶
جمع:				۲۳	۲,۵۳۱,۱۳۶	

۷-۶- قراردادهای مشاوره: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوريجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۳,۳۷۵,۵۰۰	۶	۱۳۶,۱۳۴	۴,۰٪
۲	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۱۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۳,۵۴۹	۵,۴٪
۳	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۵۶۶,۰۲۶	۶	۲۰۰,۹۲۷	۳۵,۵٪
۴	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳۲۵۵	۵۹۹,۰۰۴	۴	۲۹,۲۷۶	۴,۹٪
۵	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۵۵۶	۱,۰٪
۶	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۵	۱۱۷,۶۵۱	۳	۱۵,۹۶۷	۱۳,۶٪
۷	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱۰۴,۴۰۰	۲	۶۱,۸۷۲	۵۵,۲٪
جمع:				۲۳		

۷-۶- قراردادهای مشاوره: (ارقام به میلیون ریال):

ردیف	نام طرح	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۳۸	۰,۴٪
	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱۰۴,۴۰۰	۱	۵۰,۲۰۸	۴۸,۱٪
	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب با آب تصفیه شده	۳۰۷۰۰۳۰۱۸	۳۷۸,۷۳۲	۱	۱۴,۳۴۷	۳,۸٪
	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۹۴۳,۵۰۰	۱	۱,۵۱۰	۰,۲٪
	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۳۹۸,۷۵۰	۱	۹,۸۷۹	۱,۷٪
	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۱۵۴	۱۹۶,۰۰۵			
	طرح سرمایه گذاری بخش خصوصی		-	۱	۱۴,۴۶۶	
جمع:				۲۹		

فصل هشتم

تكاليف مجمع عمومي سال قبل

۸- ۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۲	شرکت موظف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ ه هیات وزیران و مفاد این نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران زمینه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کارشناسی را فراهم نماید. در این ارتباط ضروریست کلیه دارائی ها و اموال مشمول بیمه را احصا و با هماهنگی دفتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده ۴ این نامه یاد شده اقدام نماید	سرفصل دارایی های در جریان تکمیل شامل پیمانهای اجرایی در جریان و قراردادهایی مانند مشاوره ،خدماتی، مطالعاتی و پرداخت هایی بابت خرید زمین ،خسارت ،حق الزحمه پرسنل طرح می باشد. تمام پیمانها و قراردادهای اجرایی مشمول، بیمه شده و مستندات به حسابرسان ارائه شده است. تا حدود ۲۹۰۰ میلیارد ریال مانده حساب دارائیهای در جریان، مربوط به آن دسته از دارائیهای یاد شده بوده که مشمول پوشش بیمه ای نیستند و یا مربوط به متمم قراردادها بوده که با توجه به عدم وجود ریسک نیازی به بیمه نداشته است. صورت ریز حساب به تفکیک نوع و موضوع قرارداد و هزینه های منظور شده به حسابرسان ارائه شده است.
۳	شرکت موظف است ضمن تطبیق مانده بدهی طرح ها از بابت پرداخت حقوق و تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران با مانده ارقام دفاتر جاری اقدام نماید. ضمنا هماهنگی با دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه برای پادار نمودن اعتبار لازم در موافقت نامه ها تا تسویه نهایی مورد تاکید مجمع است	بیشترین اختلاف حساب مربوط به پرداخت مابقی حقوق پرسنل طرح در سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۱ می باشد. در جدول زیر به تفکیک هر سال اعلام شده است. (ارقام به ریال است)

۸-۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۴	شرکت موظف است نسبت به رعایت مفاد ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. مفاد ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده ۱۳ قانون مزبور مفاد مواد ۲۱، ۳۷، ۴۰، ۴۱ و ۵۱ شرایط عمومی پیمان ،	با توجه به منابع محدود دولت ، متأسفانه در سنوات اخیر تخصیص کمتر از بودجه مصوب ابلاغی بوده است، لذا موجب تاخیر در واریز بخشی از سپرده های پیمانکاران به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه، شده است. بدیهی است با ساز و کار اجرایی و مکانیزم پرداخت ها بصورت اسناد خزانه و اوراق تسویه، تمام تلاش و کوشش این شرکت بر رعایت کامل مفاد قانونی یاد شده می باشد. شایان ذکر است مطالبات برخی از پیمانکاران در پروژه های بزرگ چند برابر پرداختی به ایشان می باشد . مطابق قوانین و مقررات کس.رات هر ص.رت وضعیت محاسبه و اعمال می شود. لیکن با توجه به عدم تخصیص نقدینگی بعضا برخی از مکسوره ها با تاخیر واریز شده است. بدیهی است با ساز و کار اجرایی و مکانیزم پرداخت ها بصورت اسناد خزانه و اوراق تسویه، تمام تلاش و کوشش این شرکت بر رعایت کامل مفاد قانونی یاد شده می باشد. ماده ۲۱ باتوجه به در نظر گرفتن شرایط ریسک پروژه، تمامی پیمان ها مورد بیمه قرار میگیرند مگر در برخی موارد که ریسک قابل پذیرش باشد بیمه صورت نمی گیرد . ماده ۳۷ فقط درپروژه های کوچک با مبالغ کم به دلیل پایین بودن حجم عملیات و عدم تخصیص بموقع اعتبارات، صورت وضعیت های موقت به صورت ماهیانه تکمیل نمی گردد. در خصوص رعایت ماده ۴۰ و ۴۱ و ۵۱ شرایط عمومی پیمان ، فرایند تهیه نقشه ازبیلت ، صورتجلسات کارهای انجام شده، بررسی و رفع نواقص و تهیه صورت وضعیت قطعی زمان بر بوده و در تمام قراردادهای یاد شده تهیه و رسیدگی صورت وضعیت در دست اقدام است که پس از رسیدگی لازم صورت وضعیت مربوطه تایید و ارسال خواهد

۸- ۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۵	دو خط انتقال یاد شده در سال ۹۶ طبق توافق بعمل آمده و دستورات ابلاغی به شرکت آب و فاضلاب مشهد واگذار گردید. گزارش های مربوط به انتقال حساب دو طرح "خط انتقال آب از سد دوستی و ارداک به مشهد" در فرمت استاندارد ابلاغی تهیه و مبالغ ریالی آن مشخص گردیده است. این گزارشها به همراه سایر مستندات برای شرکت آبفای مشهد ارسال شده است. هنوز صور تجلسه مربوطه توسط آن شرکت امضاء نگردیده. قطعا پس از ثبت ریالی در حسابهای شرکت آبفای مشهد نسبت به انتقال مانده حسابهای خزانه بنام آن شرکت اقدام خواهد شد.	شرکت موظف است در خصوص آن دسته از طرح ها و پروژه های خاتمه یافته که بهره بردار آنها شرکت آب و فاضلاب استان می باشد در چار چوب مفاد نامه شماره ۵۶۶۳۲ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری موضوع قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و آئین نامه اجرایی شماره ۸۳۸۷۰/ت/۵۹۳۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ هیات وزیران اقدام نماید. با توجه به تغییر دستگاه بهره بردار طرح های ابرسانی از سد دوستی و ارداک به مشهد نسبت به انجام مراحل قانونی تحویل و تحول طرح های یاد شده به شرکت آبفای مشهد با رعایت کلیه قوانین و مقررات اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت کلیه بدهی های مترتب بر طرح های انتقالی از زمان انتقال بر عهده آبفا می باشد.

۱-۱- تکالیف مجمع عمومی سال قبل :

شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات شرکت
۶	الف- موضوع بطور مستقیم از طریق وزارت امور خارجه در دست پیگیری می باشد و از سنوات گذشته از عهده این شرکت خارج شده است. آخرین جلسه مشترک مورخ ۹۸/۷/۸ در کشور جمهوری ترکمنستان برگزار شد. ب- رای دادگاه برای شکایت این شرکت از مشاور آب پوی ابلاغ گردیده است. طبق این رای اختلاف فیما بین بایستی از طریق داوری حل و فصل شود. موضوع در دست اقدام و پیگیری است پ- اخذ مجوز تخصیص برای طرح لطف اباد در دست پیگیری می باشد. ت- نقشه برداری اراضی تمام سدها و بند های استان انجام و تأییدیه سازمان نقشه برداری اخذ گردیده است. این نقشه ها در سامانه کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک بعنوان سد جانمایی و فریز گردیده، و اکنون دفتر حقوقی در مرحله اخذ گواهی بند دال ماده ۲۶ آیین نامه اموال می باشد.	شرکت موظف است موضوع نحوه اجرای موافقت نامه بین دو کشور تا حصول نتیجه پیگیری کند. ادامه مطالعات طرح های مطالعاتی در دست اجرا را پس از اخذ موافقت اصولی تخصیص از کمیسیون تخصیص وزارت نیرو انجام دهد . بدیهی است هر گونه پرداخت برای طرح های مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محل تامین اعتبار و با هر مبلغ منوط به اخذ مجوز تخصیص است. با استفاده از کلیه راه کارهای قانونی و با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ، پیگیری در جهت تعیین تکلیف نهایی مطالبات بلوکه شده شرکت مهندسی مشاور آب پوی بابت سد بار را بعمل آورد . در اجرای دستور وزیر محترم نیرو موضوع ابلاغیه شماره ۴۹۲۴/۱۹۳/۹۹ و بر اساس مفاد آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰/ت/۲۷۲۱۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستند سازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارائیهای فاقد سند مالکیت و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی با استفاده از اعتبارات طرح های تملک اقدام به نحویکه از تحمیل هر گونه با راضافی پرهیز گردد. ضمناً ارائه جدولی از فهرست اموال و دارائی های فاقد سند ، روند اقدامات انجام شده در سال جاری و برنامه های هیات مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد تاکید است.
۷	از سنوات قبل کمیته پولشویی مطابق قوانین و دستورالعملهای ابلاغی در شرکت تشکیل و نماینده به سازمان اقتصاد و دارائی معرفی گردیده و کد مربوطه دریافت شده است. در سال جاری ۳ جلسه برگزار شده است. در راستای وظایف شرکت تمامی سامانه ها و نرم افزارهای تکلیفی خریداری، نصب و بارگزاری شده اند. هیچگونه تکلیفی برای نرم افزارهای مخصوص پولشویی ابلاغ نشده است. لطفا ارائه طریق و راهنمایی نمایید.	رعایت کامل مفاد قانون و آئین نامه های اجرایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت

فصل نهم

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

۱-۱- برنامه عملیاتی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل :

بازه زمانی پاسخگویی از زمان مقرر	تا مهلت مقرر	تا ۷ روز	بیش از ۷ روز
وضعیت پاسخگویی	مطلوب	متوسط	نامطلوب

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		درصد پیشرفت
		پیش بینی	انجام شده	
۱	تکمیل ساختار نیروی انسانی بر اساس آخرین چارت ابلاغی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	تشکیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مبالغ میلیون ریال)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵	برگزاری حداقل ۴ دوره تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶	پاسخگویی به مکاتبات در زمان مناسب	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	تهیه و تجهیز ملزومات اداری مورد نیاز گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸	اجرای الزامات و اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ خ غ تأیید شده (حداقل ۵ راهکار)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	تهیه و ارسال گزارش‌های مخاطرات آبی و حوادث به مسئولین ذیربط وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران براساس دستورالعمل ابلاغی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	پیگیری ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران و تهیه تجهیزات شرایط اضطرار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	اجرای مفاد نظام‌نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه‌های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	ساماندهی وضعیت بیمه تأسیسات و ساختمان‌های شرکت (بررسی قراردادهای بیمه ای در تأسیسات و ساختمان‌ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روشها)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	ارزیابی ریسک ساختمان‌های اداری و سدها	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	ارایه و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان‌های ستاد و امور آب‌های مناطق برحسب نیاز در شرکت‌های آب منطقه ای	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	اجرای چشم انداز و سند اجرایی مصوب مدیریت سبز	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷	تصیب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه‌ها و تأسیسات آبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸	برگزاری دوره مقدماتی آموزش امداد و نجات (کمکهای اولیه) جهت همکاران شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	برگزاری دوره مقدماتی اطفاء حریق (آتش نشانی) جهت همکاران شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	نظارت بر برنامه‌های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم‌های ایمنی و آتش نشانی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱	انجام بازدیدهای دوره ای کنترل و ارزیابی اجرای الزامات بهداشت محیط، بهداشت آب و بهداشت عمومی در بخشهای ستادی، شهرستانی و کارگاهی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۹-۲- گزارش هزینه کرد بند "س" تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

ارقام به میلیون
ریال

ردیف	شماره طبقه‌بندی دستگاه	عنوان دستگاه	عنوان پروژه‌های مندرج در موافقت نامه ۱۴۰۲	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	منبع تأمین اعتبار (پیوست شماره ۱، ردیف‌های متفرقه و...)	میزان اعتبار هزینه شده
۱		شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی	مطالعات پدافند غیرعامل سدهای مخزنی بار شهرستان نیشابور و چالیدره شهرستان طرقبه و شاندیز	۱۳۰۷۰۰۰۰۰۰ طرح عمومی مدیریت منابع آب ایران	مطالعات پدافند غیرعامل سدهای مخزنی بار شهرستان نیشابور و چالیدره شهرستان طرقبه و شاندیز	طرح	۵۶۲۱

فصل دهم

حقوقی

۱۰-۱- تعداد دعاوی مطروحه علیه شرکت واقدامات انجام شده برای حل و فصل آن در سال ۱۴۰۲:

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دعاخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
-	-	۵۵	۹۵	۱۵۰	سال قبل	دعوی مطروحه علیه شرکت
-	۲۹	۵	۶۱	۹۵	سال مورد گزارش	
-	۸	۴۳	۲۸۶	۳۳۷	سال قبل	دعوی مطروحه توسط شرکت
-	۴۴	۹۳	۱۷۵	۳۱۲	سال مورد گزارش	

۱۰-۲- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۲:

نام شرکت	پرونده		جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
	حقوقی	کیفری			له	علیه			
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	۳۷۰	۳۰۶	۴۶۶	۲۱۰	۳۶۷	۳۹	۱۰۷	۳۰۹۶۰	

۱۰-۳-۱ اخذ سند مالکیت :

اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار			بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها)				بستر سایر پیکره های آبی (اعم از مرداب ها و برکه های طبیعی)					
کل مساحت (هکتار)	اخذ سند تک برگی (هکتار)			طول آبراهه ها (کیلومتر)	مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)	اخذ سند تک برگی (هکتار)			مساحت کل (هکتار)			
	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۱	۱۴۰۲			کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۱	۱۴۰۲				
۱۳،۸۴۲	۱۰،۸۰۰	۲	۰	۱۴،۲۸۵	۵،۰۰۰	۱،۲۷۵	۰	۱۷۳	۷۲	۰	۰	۰

۱۰-۴- : اطلاعات مربوط به پرونده های کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از ابتدا تاکنون:

[illegible]

فصل یازدهم

امور اجتماعی و روابط عمومی

۱۱-۱- برنامه عملیاتی دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی، پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی

ردیف	مخاطب برنامه		وزن (درصد)	واحد	هدف	عملکرد تأییدی
۱	نشست ها، همایش ها، کنگره ها، مطبوعات	نشست با نماینده بهره برداران منابع آب	۲۰	نشست	۳۳	۳۶
۲		تبلیغات محیطی	۳	تعداد	۳۳	۴۳
۳		تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی	۵	برنامه	۳	۳
۴			۵	برنامه	۳	۳
۵			۳	برنامه	۴	۸
۶	نشست ها، همایش ها، کنگره ها، مطبوعات	مقامات قضایی	۲	جلسه	۱	۱
۷		فرماندهی نیروی انتظامی	۲	جلسه	۱	۱
۸		نیروی مقاومت بسیج	۱	جلسه	۱	۱
۹		استانداری	۲	جلسه	۱	۱
۱۰		دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی	۱	جلسه	۱	۲
۱۱		سازمان جهاد کشاورزی	۲	جلسه	۱	۱
۱۲		اداره کل صنعت و معدن	۲	جلسه	۱	۱
۱۳		اداره کل محیط زیست	۲	جلسه	۱	۱
۱۴		شهرداری	۲	جلسه	۱	۱
۱۵		شرکت های توزیع برق	۲	جلسه	۱	۱
۱۶		روحانیون	۲	جلسه	۱	۱
۱۷		سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد	۵	جلسه	۳	۴
۱۸		نمایندگان مجلس	۳	جلسه	۲	۷
۱۹		نشست با اصحاب رسانه	۴	کنفرانس مطبوعاتی	۲	۲
۲۰		برنامه های صدا و سیما استانی	۱۰	برنامه	۶	۷
۲۱		تولید و انتشار اخبار، گزارش و یادداشت	۲	تعداد	۵۰	۷۳
۲۲		اجرای طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)	۲۰	دانش آموز	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	فعالیت های خلاقانه و نوآورانه استان (بومی)		درج * به معنای تأیید است.		*	
۲۴	درصد پیشرفت پروژه با احتساب امتیاز خلاقیت و نوآوری				۱۰۰٪	

فصل دوازدهم

چالشها ، مشکلات و پیشنهادات

چالش ها و پیشنهادات

لزوم تسريع در اصلاح ماده (۲۳) ق. الحاق برخی مواد به ق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در طرح

" تامین آب (شرب و بهداشت) مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد "

* افزایش سهم اعتبارات درآمد عمومی از ۱۰ به ۶۷ درصد

* کاهش سهم اعتبارات منابع داخلی از ۹۰ به ۳۳ درصد

عدم تامین اعتبار طرح " تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد "

از منابع اعتباری رودخانه مرزی - صندوق توسعه ملی

تعیین تکلیف قانونی طرح تامین آب (شرب و بهداشت) مشهد استان خراسان رضوی از دریای عمان

چالش ها و پیشنهادات

لزوم اصلاح ماده (۲۳) ق. الحاق برخی مواد به ق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در: - طرح " تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با چاههای کشاورزی "

ارائه پیشنهاد لایحه از هیات محترم دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام چاههای کشاورزی به استفاده از پساب در آبخوان های مهم و تامین کننده آب (شرب و بهداشت)

لزوم تامین اعتبار لازم خرید چاه جهت تامین اب (شرب و بهداشت) با استفاده از ظرفیت قانونی لایحه " تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت " مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

عدم موافقت با اعتبار پیشنهادی دستگاه اجرایی وعدم تناسب اعتبارات مصوب با مبالغ ریالی تعهدات

چالش ها و پیشنهادات

لزوم تعیین تکلیف نحوه تامین مالی و برق طرح های اضطراری تامین آب (شرب و بهداشت)

لزوم پیش بینی اعتبار در فصل ششم (زمین) در موافقتنامه طرح " ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب " به شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰ برای شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مشکلات شدید در عدم تخصیص بموقع اعتبارات مصوب طرح ها

لزوم بازنگری در نحوه سرمایه گذاری شرکت های آب و فاضلاب به موضوع پساب

ضعف فنی و مالی مشاوران بعثت مهاجرت نخبگان و عدم تمایل کارشناسان خبره به فعالیت در این شرکت ها

لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی طرح

پیوست‌ها


پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار از منظر تامین منابع مالی

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۳	هزینه شده تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اعتبار مورد نیاز(*)	اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار تخصیص یافته سال ۱۴۰۳
۱	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	۲,۷۲	۲,۲۷۵,۰۴۹	۱۱۸,۶۰۰,۱۳۲,۰۰۰	۲,۰۴۶۷,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۰۰
۲	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوربجه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۶۱,۵۵	۱۱,۱۳۴,۷۹۹	۱۵,۸۶۵,۲۰۱	۸,۷۴۹,۸۸۴	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۴۱,۱	۱,۲۷۷,۰۱۱	۹,۲۲۲,۹۸۹	۱,۰۹۶,۴۷۱	۴۴,۵۰۰
۴	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۴۸,۴۵	۸۵۲,۶۰۴	۵۴۰,۶۸۶	۴۷۴,۲۸۲	--
۵	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	۶۵,۴۹	۱,۲۱۹,۶۴۰	۶۳,۵۸۲,۲۶۴	۱۹۸,۰۹۵	-
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب							
۶	سامانه آبیگر شناور سد مخزنی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۸۰,۹۳	۴۷۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۷	حفاری چاههای تامین آب مشهد از آبخوان مشهد	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۶۹,۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۸	تامین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱۵,۶۶		۷,۵۰۰,۰۰۰	--	--
۹	ابرسانی از سد تبارک به شهر قوچان	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۷	۱,۴۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--	--
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور							
۱۰	عملیات ساماندهی ساماندهی رودخانه کلات (در محدوده شهری - مرحله (۲)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۶۴,۴	۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۹,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۸۳,۱۰۰
۱۱	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۷۵,۶	--	۱,۵۰۰,۰۰۰	--	--

پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمانبندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۳		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
۱	تامین آب شر مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد	۱۳۰۷۰۰۲۳۱۴	۲,۷۲	۲,۹۴	مشکلات تامین اعتبار
۲	اجرای خط انتقال آبخوان غرب به شهر مشهد	سرمایه گذاری	۶۸,۵۵	۱۰۰	مشکلات اجتماعی
۳	ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شور یچه	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۵	۶۱,۵۵	۶۶,۶۳	مشکلات اجتماعی
۴	آبرسانی به شهرهای نیشابور و فیروزه از سد بار	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۴	۴۱,۳	۶۱,۵۵	عدم تامین اعتبار
۵	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۰۷۰۰۲۰۴۱	۴۸,۴۵	۵۱,۳	عدم تامین اعتبار
۶	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۸	۶۵,۷۱	۷۵,۶۰	عدم تامین اعتبار



پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمانبندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۳		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقاء کیفی آب					
۷	سامانه آبیگر شناور سد مخزنی دوستی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۸۰,۹۳	۹۷	عدم شرکت مناقصه گران
۸	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان غرب	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۶۰,۲	۶۷,۸۱	عدم تامین اعتبار
۹	تأمین آب (شرب و بهداشت) شهر مشهد از آبخوان مشهد، حفاری و تجهیز و انتقال ۵۰ حلقه چاه	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۱۵,۸۶	۵۴	عدم تامین اعتبار
۱۰	آبرسانی از سد مخزنی تبارک به شهر قوچان	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۹۷	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۱۱	تاسیسات پیش تصفیه و کاهش بار جلبکی آب سد مخزنی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	۸۴,۳۴	۹۳	عدم تامین اعتبار



پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمان بندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۳		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
مطالعه و اجرای ساماندهی ، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هادر حوضه ابریز کشور					
۱۲	بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۷۵,۶	۹۹,۵	عدم تامین اعتبار
۱۳	ساماندهی رودخانه کلات در محدوده شهری - مرحله (۲)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۶۴,۴	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
طرح تامین زیر ساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی					
۱۴	آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (۵) شهرستان مشهد	۱۳۰۴۰۱۲خ۱۰۲	۱۹,۱۵	۵۰	عدم تامین اعتبار
طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی / پروژه : تغذیه سفره های آب زیر زمینی					
۱۵	بهسازی، ترمیم و افزایش کارایی (راندمان) تغذیه مصنوعی شاندیز	۱۳۷۰۰۶خ۶۶۶	۸۶,۶	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۱۶	ساماندهی سازه های تغذیه مصنوعی فاروب	۱۳۰۷۰۰۶خ۶۶۶	۹۰	۱۰۰	عدم تامین اعتبار

پیشرفت فیزیکی طرحها مطابق برنامه زمانبندی اعلامی شرکت مادر تخصصی

(به همراه ذکر دلیل عدم تحقق)

ردیف	نام طرح / پروژه	شماره طبقه بندی	درصد پیشرفت فیزیکی آذر ماه ۱۴۰۳		علل عدم تحقق
			واقعی	پیش بینی	
طرح ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب					
۱۷	کانال انتقال آب جمعاب شهرستان چناران	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۴,۳۸	۱۱,۲۹	مشکلات اجتماعی
۱۸	احداث، مرمت و بهسازی دهانه های آبیگر کشاورزی شرخس	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۱۲,۱۵	۱۹,۷۸	عدم تامین اعتبار
۱۹	اصلاح بند انحرافی و کانال انتقال آب رودخانه خرو	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۱,۴	۲,۴	عدم تامین اعتبار
۲۰	عملیات اجرایی احداث دهانه های آبیگر رودخانه کپکان - گرنی	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۰,۸۱	۳,۲۳	عدم تامین اعتبار
۲۱	احداث مقسم و کانال انتقال آب اسجیل - دولت آباد	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۴۰,۲۷	۹۸,۴۸	مشکلات شدید اجتماعی
۲۲	احداث سازه آبیگر و اجرای خط انتقال رواناب رودخانه شوررود	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۵۵	۴۵,۱۲	۵۲,۰۸	مشکلات شدید اجتماعی
اجرای ساماندهی رودخانه ها					
۲۳	عملیات بازگشایی و ساماندهی رودخانه حمام قلعه در محدوده روستای ژرف	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۰۵	۱۰۰	۱۰۰	عدم تامین اعتبار
۲۴	ساماندهی رودخانه کلات در محدوده شهری - مرحله (۱)	۱۳۰۷۰۰۳ خ ۲۰۵	۱۰۰	۱۰۰	عدم تامین اعتبار

**ارائه گزارش عملکرد نحوه استقرار نظام نامه
حاکمیت شرکتی و تشکیل جلسات کارگروه های
مربوطه از جمله کارگروه حسابرسی، مدیریت
ریسک و انتصابات و جبران خدمت**

کمیته حاکمیت شرکتی

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	محمد علی نعمت نژاد	رئیس و عضو کمیته	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
		۲	علیرضا عامری	نایب رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۳	فیروزه یحیی زاده	دبیر و عضو کمیته	رئیس حسابرسی داخلی و عضو علی البدل هیات مدیره
		۴	غلامرضا ممدوحی	عضو کمیته	معاون حفاظت و بهره برداری
		۵	محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
		۶	مجتبی برغمندی	عضو کمیته	معاون برنامه ریزی
		۷	حسین پور اول	عضو کمیته	معاون طرح و توسعه
		این کمیته مطابق دستورالعمل ابلاغی در سال ۱۴۰۳ تشکیل گردید. ۳ جلسه در سال جاری برگزار شده است. اهداف کلان شرکت مطابق برنامه های ابلاغی و اساسنامه مرور شده است.			

سامانه حاکمیت شرکتی

سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی - منابع آب ایران												
سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی - منابع آب ایران												
اموال فیزیکی خانه های سازمانی مولدسازی دارایی ها علیرضا خردمند												
امور مجامع نظارت مالی کمیته ها												
ایجاد جلسه جدید + گزارش ساز سطر ۲۵ جستجو												
نوع جلسه	جلسه در خصوص دوره مالی	عنوان شرکت	تاریخ جلسه	ساعت شروع	-	شرح و موضوع	دعوتنامه	-	صورتهجلسه	تکالیف	تکالیف	آپلود
	عادی سالیانه	۱۴۰۲	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰۹:۰۰	دستورات	مجمع عمومی تصویب صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سال ۱۴۰۲				تکالیف	
	عادی بطور فوق العاده	۱۴۰۲	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰۸:۳۰	دستورات	مجمع عمومی انتخاب اعضای هیئت مدیره				تکالیف	
	عادی بطور فوق العاده	۱۴۰۱	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴:۰۰	دستورات	تصویب صورت های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای سال ۱۴۰۱				تکالیف	
	عادی سالیانه	۱۴۰۱	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۴:۰۰	دستورات	تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱				تکالیف	
	عادی بطور فوق العاده	۱۴۰۱	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴:۰۰	دستورات	مجمع عمومی انتخاب اعضای هیئت مدیره				تکالیف	
	عادی بطور فوق العاده	۱۳۹۹	آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴:۴۷	دستورات	مجمع عمومی انتخاب اعضای هیئت مدیره				تکالیف	

سامانه حاکمیت شرکتی

سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی - منابع آب ایران

امور مجامع

نظارت مالی

کمیته ها

انتخاب شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی

نوع جلسه
کلیه موارد

گزارش حسابرسان الزامات قانونی سیاست های مجمع

درج اقدامات	سوابق اقدامات	شرکت	دوره مالی	موضوع جلسه مجمع	ردیف	بند	جزء	خلاصه بند حسابرسان	شرح تکلیف
		آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۱	تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱	۱			اظهار نظر مشروط	صورتهای مالی شرکت سهامی آب منطقهای خراسان رضوی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این سازمان، حسابرسان شده است. به نظر این سازمان به استثنای آثار احتمالی ناشی از موارد مندرج در بندهای ۲ الی ۴ بخش مبنای اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.
		آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۱	تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱	۱	۱		مقدمه	صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت های تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۰، توسط این سازمان حسابرسان شده است.
		آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۱	تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱	۲	۳		نحوه شناسایی درآمدهای شرکت	به شرح یادداشت توضیحی ۵-۲۰ و ۵-۳۰، در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۴۲ میلیارد ریال از درآمدهایی که در سالیان قبل به طریقت دریافتی های تجاری شناسایی شده و مربوط به چاه های فاقد برداشت آب و یا بر اساس پروانه بهره برداری و یا مقادیر قراردادهای فروش آب به شرکتها بوده، برگشت داده شده است. مدارک و مستندات کافی در خصوص عدم قابلیت وصول این بخش از درآمدها به این سازمان ارائه نشده و به دلیل عدم دسترسی به شواهد و مدارک مورد لزوم تعیین تاثیر احتمالی ناشی از مورد فوق بر صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.
		آب منطقه ای خراسان رضوی	۱۴۰۱	تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱	۳	۴		مسئولیت مدیرعامل و ذی حساب درقبال صورتهای مالی	مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، با مدیر عامل و ذی حساب است ، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است به گونه ای که این صورت ها ، عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

اموال فیزیکی خانه های سازمانی مولدسازی دارایی ها علیرضا خردمند

سامانه حاکمیت شرکتی

سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی - منابع آب ایران

موندسازی دارایی ها فیروزه بختی زاده

امور مجامع

اعضاء هیات مدیره

مصوبات هیات مدیره

بخش عمومی

جلسات هیات مدیره

موردی انتخاب نشده است

شرکت آب منطقه ای خراسان

جستجو...

۹۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶-۰۷:۳۰

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

۹۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲-۰۷:۰۵

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

۹۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۰۷:۲۸

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

۹۵۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲-۰۴:۳۰

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

۹۵۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲-۰۴:۲۸

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

۹۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷-۰۷:۰۱

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

سامانه استقرار و پایش حاکمیت شرکتی - منابع آب ایران

موندسازی دارایی ها فیروزه بختی زاده

رویه جدید خروجی اکسل

گزارش ساز

۵۰

جستجو

ردیف	شرکت	نام	نام خانوادگی	تاریخ تولد	کد ملی	جنسیت	وضعیت تاهل	تعداد فرزند	نوع استخدام	تاریخ استخدام	مدت خدمت	پاسخ شماره	تخصصیات	سوابق علمی	سوابق اجرایی	دوره های آموزشی	تقدیر و نشان	وضعیت مرتبط
۱	هیات مدیره	آب منطقه ای خراسان رضوی	محمد علی	نصرت نژاد	۱	۵۶	مترشح	۱	دائم	۱۳۷۵/۱۲/۰۱	۲۸	۰۹۱۵۳۶۹۰۳۱						
۲	هیات مدیره	آب منطقه ای خراسان رضوی	علیرضا	عاصمی	۲	۵۱	مترشح	۲	دائم	۱۳۷۵/۰۹/۱۷	۲۸	۰۹۱۵۵۱۰۴۵۰						
۳	هیات مدیره	آب منطقه ای خراسان رضوی	سپهر	بختی زاده	۳	۵۲	مترشح	۳	دائم	۱۳۷۵/۰۳/۲۷	۲۸	۰۹۱۵۳۷۳۳۰۵						

۳ از ۳

کمیته حسابرسی داخلی

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	غلامرضا ممدوحی	عضو کمیته	معاون حفاظت و بهره برداری
		۳	محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
		۴	مجتبی برغمندی	عضو کمیته	معاون برنامه ریزی
		۵	مهران خجسته	عضو کمیته	مدیر مالی و ذیحساب جاری
		۶	علیرضا کریمی	عضو کمیته	رئیس اداره حسابداری
		۷	فیروزه یحیی زاده	دبیر کمیته	رئیس گروه حسابرسی داخلی و عضو علی البدل هیات مدیره
تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۱ : ۲۵ جلسه					
تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲ : ۲۲ جلسه					

کمیته ریسک

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر/ اعضای کمیته/ واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	امیر گرد نوشهری	عضو کمیته	مدیر تحول اداری و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
		۳	سید مجید حسینی	عضو کمیته	کارشناس طرح ها
		۴	سمانه عاملی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
		۵	رضا براتی	عضو کمیته	رئیس گروه تحقیقات کاربردی
		۶	کیوان کرباسی	عضو کمیته	کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
		۷	محمد رشیدی	دبیر کمیته	رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
		این کمیته در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد. مجدداً در سال ۱۴۰۳ اعضا به شرح یاد شده منصوب گردیدند. تا تاریخ تأیید صورتهای مالی ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ تعداد ۴ جلسه برگزار شده است.			

بررسی ریسک فرآیندها



کتابچه فرآیند نظارت بر مطالعه و اجرای طرح ها / پروژه های توسعه

کد مدرک: PI414401
تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۸/۱۷
شماره بازنگری: ۰۳
صفحه ۳ از ۴

۶- تعاملات و ارتباطات:

خروجی ها:			ورودی ها:		
ردیف	نام خروجی	مشتري / مخاطب خروجی	ردیف	نام ورودی	تامین کننده ورودی
۱	پروژه تکمیل شده	دستگاه بهره بردار	۱	ابلاغیه و اسناد پیمان	فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکار ذیصلاح و عقد قرارداد
۲	نقشه های چون ساخت (ازبیلست)	دستگاه بهره بردار	۲	ابلاغیه قراردادهای مشاوران	فرآیند ارزیابی و انتخاب مشاور ذیصلاح و عقد قرارداد
۳	گزارش ارزیابی پیمانکار و مشاور (فاز ۳)	فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکار/مشاور ذیصلاح و عقد قرارداد	۳	کلیه نقشه ها و گزارش های مصوب (گزارش های فنی، اجتماعی و ...)	فرآیند نظارت بر پروژه های مطالعاتی
۴	طرح مصوب شامل (گزارشات مشتری فرآیند/ سازمان های مرتبط جهت اخذ تأییدیه)	مطالعاتی، نقشه ها و اسناد مناقصه)	۴	استعلام و پرداخت خسارت به اراضی محدوده طرح ها	فرآیند تملک(دفتر حقوقی)
۵	گزارشات پیشرفت مطالعات پروژه شامل (گزارشات مالی، تاخیرات، پیشرفت فیزیکی، فنی و ...)	مدیران ارشد/ فرآیند تجزیه، تحلیل و بهبود	۵	افلام و تجهیزات پیشنهادی کارفرما	فرآیند خرید(امور بازرگانی)
۶	سیمای طرح	مشتری فرآیند	۶	الزامات قانونی و سازمانی	مراجع قانونی بالادست/ مدیران ارشد
۷	تأییدیه سازمان های مرتبط	معاونت طرح و توسعه	۷	نامه درخواست تهیه طرح مطالعاتی	اشخاص حقیقی و حقوقی
۸	نظرسنجی عملکرد مشاور	فرآیند تجزیه، تحلیل و بهبود	۸	نیاز به مطالعه	معاونت طرح و توسعه و سایر معاونت های شرکت

نظارت بر مطالعه و اجرای طرح ها - پروژه های توسعه

Author: KHAIJIE
Version: ۱.۰
Description:

تهیه مستندات فنی و نقشه های
اجرایی جهت برگزاری مناقصه
پیشنهاد میگردد

گزارش، نقشه های کاداستر
جهت تملک یا پرداخت خسارت
پیشنهاد میگردد

دو فرایند دیگر در حوزه طرح و توسعه بررسی و نقاط ریسک آن

شناسایی شده است:

*روش اجرایی نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه

*فرآیند امکانسنجی و انجام مطالعات توسعه منابع آبی

کمیته انتصابات

نام شرکت	نوع	ردیف	مشخصات مدیر / اعضای کمیته / واحد حسابرسی داخلی		
			نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت سازمانی
آب منطقه ای خراسان رضوی	کمیته	۱	علیرضا عامری	نایب رئیس و عضو کمیته	مشاور و جانشین مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره
		۲	محمد زنگویی	عضو کمیته	معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
		۳	سمانه عاملی	عضو کمیته	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
		۴	مدعو	عضو مدعو	معاون مربوطه
تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۲: ۳ جلسه					

گزارش در ارتباط با اجرای مفاد آیین نامه اجرائی مولدسازی دارایی های دولت

خلاصه وضعیت برنامه مولد سازی اراضی - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

ردیف	نام ملک	مساحت (متر مربع)	ارزش برآوردی سال ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)	روش ارزش افزایی پیشنهادی	وضعیت ارزش افزایی	آخرین وضعیت	نام پروژه متناظر برای تهاتر	برآورد هزینه مورد نیاز (میلیارد ریال)	مجوز های اخذ شده
۱	اراضی پایاب سد چالیدره	۵۷۲۲۵	۱۴۰۰۰	اراضی پایاب و مخزن سد چالیدره با قابلیت توسعه فعالیت های گردشگری به عنوان آورده قابل مولد سازی مصوب شده است.	کسب مجوز تغییر کاربری اراضی به گردشگری از کمیسیون امور زیربنایی استان	متوقف به دلیل عدم اخذ سند تک برگ	فاز دوم - تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی زون یک	۷۰۰۰	کارگروه مولد سازی استان
							فاز اول - تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی هزار مسجد (اجرای تونل آب بر توسط موسسه فاطر)	۷۰۰۰	
۲	اراضی پایاب سد کارده	۴۹۲۲۰	۹۰	تغییر کاربری به خدمات و یا صنعتی (دامداری ، مرغداری و ...)	در مرحله پیگیری	به دلیل ارزش پایین زمین از اولویت خارج شده است	تصمیم گیری نشده است.		
۳	اراضی پاسیاران سرخس	۸۱۰۰۰	۲۵	تغییر کاربری به خدمات و یا صنعتی (دامداری ، مرغداری و ...)	در مرحله پیگیری	به دلیل ارزش پایین زمین از اولویت خارج شده است	تصمیم گیری نشده است.		

اراضی چالیدره



اراضی پاسیاران سرخس




اراضی کارده



طرح های هدف مولد سازی

فاز اول - تامین آب مشهد از منابع آب مرزی یال شمالی هزارمسجد

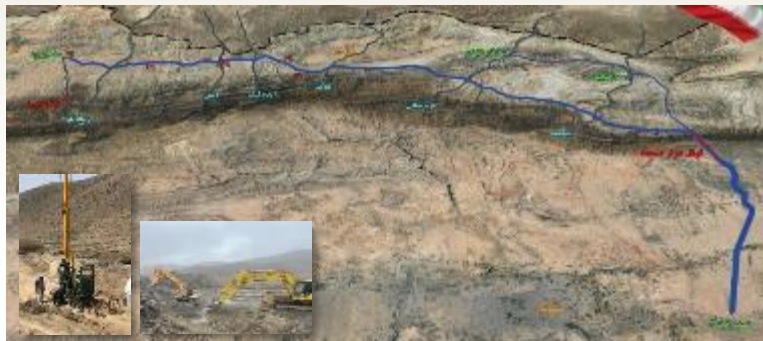

فاز یک در دست اجرا: تونل آب بر به طول ۸٫۵ کیلومتر



۱۰ میلیون متر مکعب

۱۵۰ میلیارد تومان


هدف پروژه 

مطالبات تاکنون

۲۵۰۰ میلیارد تومان

مبلغ مورد نیاز پروژه

فاز دوم - تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی زون یک

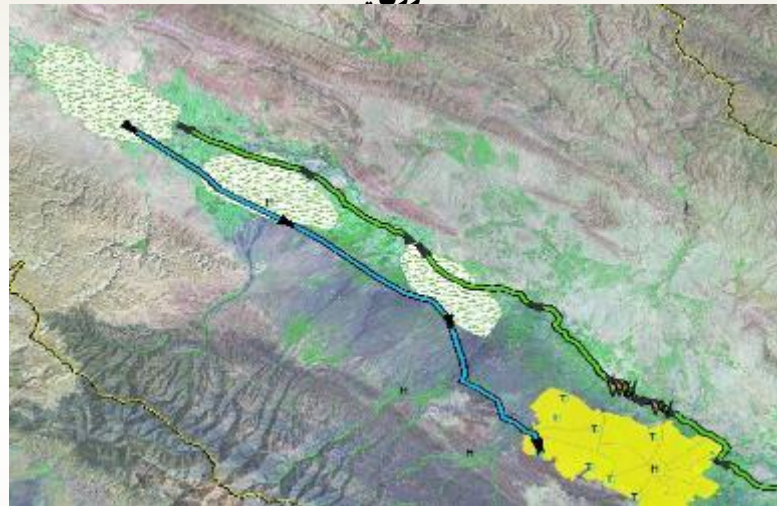

لزم اخذ مجوز ماده ۲۳ برای افزایش اعتبار مورد نیاز



۳۵ میلیون متر مکعب

۹۷ میلیارد تومان

هدف پروژه 

هزینه شده

۱۵۰۰ میلیارد تومان

مبلغ مورد نیاز تا اتمام پروژه

جلسه تفاهم نامه مولد سازی وزارت نیرو و استانداری



استانداری خراسان رضوی
پست: ...
تاریخ: ۱۴۰۲

با صلوات بر محمد و آل محمد

مضوبه کار گروه استانی مولدسازی دارایی های دولت

دومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت رأس ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در محل استانداری خراسان رضوی تشکیل و به استناد تقویم بخشی از اختیارات مولدسازی دارایی های دولت به استانداران موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۷۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ سازمان خصوصی سازی، در خصوص موارد زیر تصمیم گیری و مشور شد این پیشنهادات به منظور اخذ مضوبه هیات عالی مولدسازی به دبیرخانه هیات ارسال شود:

۴- سازاد بودن تعداد یک فقره از املاک با بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی (پیوست ۵) مورد تایید کارگروه قرار گرفت و پیشنهاد شد در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت، با فروش اقساطی املاک یادشده

محمدحسین باوقعی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

محمدحسین باوقعی
نایب رئیس و عضو مرکز خراسان رضوی

سید محمد حسینی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

جواد خدایی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی

محمودرضا عظیمی
استاندار خراسان رضوی

سامانه مولد سازی

پورتال حاکمیت شرکتی - مولدسازی دارایی ها

حاکمیت شرکتی

گزارش ساز

ثبت دارایی ها

گردش وجود

گزارشات

داکیورها

صفحه اصلی

جستجو

۲۵

گزارش ساز

ثبت اولیه

شرکت	نوع	نوع سند	کد پستی	ارزش دفتری	آدرس نشانی	مساحت مرصه	مساحت بنا	پوشه	ترتیب اولویت	ملاحظات	وضعیت
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۲۲۰			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۸۱۷۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی	مرصه	وزارتی	نک برگ	ندارد		۴×۱۷.۵			اولویت		ثبت اولیه

۱۲ از ۱۲

**گزارش در ارتباط با نحوه تسویه و تهاتر
بدهی ها با استفاده از ظرفیت های قانون
بودجه سال ۱۴۰۲**

استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسویه مطالبات

میلیون ریال

ردیف	نام ارگان	مانده ابتدای دوره سال ۱۴۰۲	تسویه شده از طریق اوراق تسویه	قبوض صادر شده طی سال ۱۴۰۲	مانده پایان دوره سال ۱۴۰۲
۱	ارتش	۱۲۵،۸۲۷	۱۲۵،۸۲۷	۷۴،۸۶۷	۷۴،۸۶۷
۲	سپاه	۴۱،۶۳۰	۴۱،۶۳۰	۳۵،۶۰۳	۳۵،۶۰۳
۳	نیروی انتظامی	۱۵،۵۶۵	۱۵،۵۶۵	۱۰،۳۲۹	۱۰،۳۲۹
	جمع	۱۸۳،۰۲۲	۱۸۳،۰۲۲	۱۲۰،۷۹۹	۱۲۰،۷۹۹

استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسویه مطالبات

وزارت نیرو
 شرکت توسعه و مدیریت منابع آب ایران
 شماره و ثبت صادره: ۱۳۸۷/۲۲/۱۱۱
 تاریخ ثبت صادره: ۱۳۸۷/۲۲/۱۱
 شماره و چاپخانه: ۱۳۸۷/۲۲/۱۱

جسٹس تولید یا اشتراکیت ہو گا

روسانی هیات مدیره و مدیران عامل محترم شرکت های سهامی آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

مطالعات از نیروی های مسلح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

شجاع حسین ری والا

مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی



2000

گورکھ پرائیوٹ لیمیٹڈ، سی۔ او۔ ڈی. ۲۷۳، نیشنل روڈ، لاہور۔ فون: ۳۴۵۰۰۰۰، ۳۴۵۱۰۰۰

شرکت ماکر تخصصی منابع آب ایران										
نام متقاضی	مطالبات از نیروهای	مبلغ نهائری	درصد نهائری	ارتنس		سپاه		فرابدا		وزارت دفاع
				مبلغ نهائری	مبلغ بدهی	مبلغ نهائری	مبلغ بدهی	مبلغ نهائری	مبلغ بدهی	
آب منطقه ای قم	۸۸,۹۷۶	۷۳,۰۱۶	۸۲,۳۲	۲۶,۱۲۰	۳۱,۵۰۷	۶۲,۵۵۶	۵۱,۵۰۹	۰	۰	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان کرمان	۴۱۹,۷۶۴	۲۱۹,۷۶۴	۱۰۰	۱۵۷,۱۴۴	۱۵۷,۱۴۴	۳۷,۲۲۵	۳۷,۲۲۵	۱۵۶	۲۰,۲۲۸	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان قزوین	۲۴۰,۵۸۳	۱۹۰,۴۲۱	۷۹,۰۷	۱۶۲,۶۷۲	۲۰۵,۴۸۷	۲,۴۱۳	۱,۹۰۸	۱۳,۷۲۶	۱۰,۸۶۱	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان خراسان جنوبی	۵۸,۵۴۶	۵۸,۵۴۶	۱۰۰	۳۹,۳۹۹	۸,۹۵۹	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹	۱۰,۱۸۸	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای کرمانشاه	۱۲۱,۳۶۱	۱۱۳,۸۲۲	۱۰۰	۱۲۵,۸۲۷	۶۰,۳۵۷	۶۱,۶۳۰	۱۵,۵۶۵	۱۵,۵۶۵	۰	مبلغ نهائری
سپاه ای آب منطقه ای کرمانشاه	۱۸۳,۰۲۲	۱۸۳,۰۲۲	۱۰۰	۱۲۵,۸۲۷	۱۲,۱۶۱	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	مبلغ بدهی
سپاه ای آب منطقه ای البرز	۲۲,۵۵۲	۲۷,۱۰۲	۰	۳,۹۰۶	۳,۹۰۶	۰	۰	۲۵۱	۱۹,۲۴۵	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان گیلان	۲۳,۷۸۱	۱۹,۵۰۰	۸۱,۹۷	۹۷,۴۵۵	۹۱,۶۱۹	۰	۰	۱,۳۲۹	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان لرستان	۱۸۹,۴۴۱	۱۷۸,۰۲۲	۹۳,۸۸	۵۲,۵۰۲	۵۲,۵۰۲	۶۲۸,۱۷۶	۶۲۸,۱۷۶	۲۰,۴۹۵	۰	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان فارس	۱,۳۱۱,۳۷۳	۱,۳۱۱,۳۷۳	۱۰۰,۰۰	۹۸,۴۰۴	۵۷,۱۶۸	۰	۰	۱,۳۲۰	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان مازندران	۱۱۰,۴۲۸	۶۹,۱۹۹	۵۸,۱۲	۲,۸۵۳	۲,۸۵۳	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۱,۲۴۰	۰	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان هرمزگان	۵۰۳,۶۹۴	۵۰۳,۶۹۴	۱۰۰	۵۰۰,۳۶۹	۵۰۰,۳۶۹	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	۱,۸۲۲	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان یزد	۱۸۱,۰۷۲	۱۸۱,۰۷۵	۱۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۴۴۶	۰	۵۵۸	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان خراسان شمالی	۳۵,۴۴۶	۳۵,۴۴۶	۱۰۰	۲۴,۹۹۲	۲۴,۹۹۲	۲,۴۶۰	۲,۴۶۰	۴۱۶	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان همدان	۲۷,۳۶۹	۲۷,۳۶۹	۱۰۰	۰	۰	۲۲,۲۰۵	۲۲,۲۰۵	۰	۰	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان اردبیل	۲۲,۲۰۵	۲۲,۲۰۵	۱۰۰	۰	۰	۵,۵۲۸	۵,۵۲۸	۱,۰۱۲	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان گلستان	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰	۱۰۰	۳۱۴,۸۹۹	۳۱۴,۸۹۹	۰	۰	۱۶,۶۱۲	۰	مبلغ نهائری
آب و برق استان خوزستان	۳۷۲,۰۵۱	۳۷۲,۰۵۱	۱۰۰	۱۱۳,۴۰۹	۴۹,۱۷۰	۲۵,۴۱۵	۲۵,۴۱۵	۱۶,۹۱۲	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان	۲۲۸,۳۶۴	۵۸,۲۲۸	۲۵,۷۲	۰	۰	۹۸,۵۶۸	۹۸,۵۶۸	۰	۰	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان چهارمحال	۹,۸۵۶۸	۵۸,۵۹۲	۸۸,۸۷	۲۰,۱۲۲	۲۰,۱۲۲	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۲۵۰	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی	۳۰,۶۱۶	۳۰,۶۱۶	۱۰۰	۴۱,۳۱۶	۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲	۲۰,۲۹۳	۴,۳۵۳	۲۴۵	مبلغ نهائری
آب منطقه ای استان زنجان	۸۱,۴۵۲	۲۸,۲۸۲	۵۸,۲۸	۱۷,۳۶۶	۴,۳۷۲	۱۷,۴۱۸	۱۷,۴۱۸	۱,۰۷۲	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای استان مازندران	۹۰,۸۷۲	۱۵۲,۵۴۶	۹,۶۸	۰	۰	۱۶۵,۳۶۱	۱۶۵,۳۶۱	۶,۳۵۷	۵۲,۴۱۸	مبلغ نهائری
سازمان آب منطقه ای تهران	۱,۵۷۲,۹۳۷	۱۵۲,۵۴۶	۱۰۰	۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	۲۸,۰۰۲	۲۸,۰۰۲	۰	۰	مبلغ بدهی
سپاه ای آب منطقه ای مرکزی	۳۹,۹۶۳	۳۹,۹۶۳	۱۰۰	۰	۰	۱۵,۴۴۲	۱۵,۴۴۲	۰	۰	مبلغ نهائری
سپاه ای آب منطقه ای اصفهان	۵۷۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۸۰۰	۶۸۰۰	۰	۰	مبلغ بدهی
دره‌های آب منطقه ای بوشهر	۶۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۶۵	۸۲,۵۶۵	۰	۱۵,۸۱۶	مبلغ نهائری
سپاه ای آب منطقه ای سمنان	۲۹۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ بدهی
آب منطقه ای آذربایجان و تبریز احمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ نهائری

The background features several thick, translucent blue wavy lines that flow across the frame, creating a sense of movement. Interspersed among these lines are several small, solid blue squares of varying sizes. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on fluidity and geometric shapes.

با تشکر از اعضاء محترم مجمع عمومی
شرکت آب منطقه ای
